



**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 2021-2027 Г.
ЗА 2025 Г.**

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на таблиците	3
Списък на фигурите	3
Списък на използваните съкращения.....	4
1. Въведение	5
2. Общи условия за изпълнението на ПИРО 2021-2027 и в частност промените в социално-икономическите условия на общината	7
2.1. Демографско развитие.....	8
2.2. Икономическо развитие	9
2.3. Пазар на труда	9
2.4. Социално развитие.....	10
3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение	12
3.1. Индикатори за резултат	12
3.2. Индикатори за продукт.....	18
4. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО	37
5. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране	39
6. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО	45
7. Приложения	47

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. Основни демографски показатели	8
Таблица 2. Ключови икономически показатели	9
Таблица 3. Състояние на пазара на труда.....	9
Таблица 4. Ключови показатели в областта на образованието	10
Таблица 5. Ключови показатели в областта на здравеопазването	11
Таблица 6. Социални услуги, капацитетът им и броят потребители към 2025 г.....	11
Таблица 7. Постигнат напредък по индикаторите за резултат на ПИРО към 2025 г.....	14
Таблица 8. Постигнат напредък по индикаторите за продукт на ПИРО към 2025 г.....	20
Таблица 9. Обобщена финансова таблица по приоритети за 2025 г.....	44

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО	6
Фигура 2. Проектна стойност и реално изплатени средства по проекти и дейности, разпределени по приоритети за 2025 г.....	40
Фигура 3. Средна стойност (дясна скала) и брой (лява скала) на текущите и изпълнени през 2025 г. проекти/дейности	42
Фигура 4. Индикативното финансово разпределение по приоритети в ПИРО Харманли 2021-2027 г. (в лева)	43
Фигура 5. Разпределение на реално изплатените средства по приоритети в ПИРО Харманли през 2025 г. (в лева).....	43
Фигура 6. Индикативно разпределение по източници на финансиране в ПИРО Харманли 2021-2027 г. (в лева).....	44
Фигура 7. Разпределение на реално изплатените средства по източници на финансиране в ПИРО Харманли през 2025 г. (в лева)	44

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ВОСКС	Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ДИ	Други източници
ДМА	Дълготрайни материални активи
ЕС	Европейски съюз
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
НП	Национална програма
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НПО	Неправителствена организация
НСИ	Национален статистически институт
НУ	Начално училище
НЧ	Народно читалище
ОБ	Общински бюджет
ОП	Общинско предприятие
ОУ	Основно училище
ПГЕТ	Професионална гимназия по електропромишленост и текстил
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ПО	Програма „Образование“ 2021-2027 г.
ПП	Програмен период
ППР	Планово-проектни работи
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПРЧР	Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027 г.
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП	Подробен устройствен план
ПХОМП	Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г.
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ФЕЦ	Фотоволтаична електрическа централа
ЦБ	Централен бюджет
ЧИ	Частни инвестиции
ЮЦР	Южен централен регион
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics Наука, Технологии, Инженерство и Математика

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Харманли за периода 2021-2027 г. е фундаментален, стратегически документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие на територията на общината. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. ПИРО продължава традицията на общинските планове за развитие да определя бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

Изпълнението на заложените в плана мерки, дейности и конкретни проекти за развитие се отчитат чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Основа за изготвянето на докладите е информацията, която се събира чрез действащата в Общината система за наблюдение и оценка на плана.

Целта на годишния доклад е да се проследи изпълнението на ПИРО през календарната година и да се дадат насоки за бъдещото му изпълнение, чрез анализиране на ключови социално-икономически показатели, предварително избрани в ПИРО индикатори и осъществени проекти и дейности.

Обект на годишния доклад е изпълнението на ПИРО, действащ за територията на община Харманли, която включва общинския център – гр. Харманли и още 24 населени места.

Предмет на годишния доклад е изпълнението на целите и приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите през календарната година. Докладът представя степента на напредък по индикаторите за продукт и резултат, предвидени в плана, като отчита постигнатите стойности, тенденциите в изпълнението и приноса на реализираните мерки за постигане на стратегическите цели на общината. В доклада се прави преглед и на организацията и методите за изпълнението на плана, прилагани от съответните органи и звена.


Съгласно чл. 23 от Закона за регионалното развитие, кметът на общината *„ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“* в т.ч. *„представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет“*. Кметът е натоварен и с функцията да *„осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и на действията по реализацията му“*.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие в цялостния процес на наблюдение и оценка, при спазване на принципа за партньорство, участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданските общности в общината.

Годишният доклад се одобрява от общински съвет по предложение на кмета на общината.

След одобряването на доклада същият се публикува на сайта на Общината и се предприемат действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО

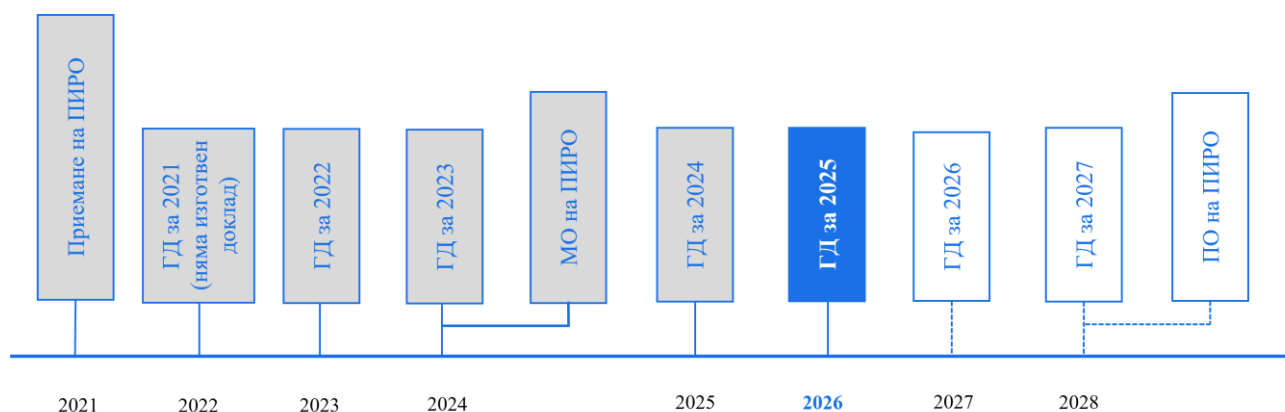

Настоящият доклад представя резултатите от извършеното наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Харманли 2021-2027 и обхваща периода между 01.01.2025 г. и 31.12.2025 г. Това е петият документ за наблюдение и оценка на ПИРО Харманли. С докладите за наблюдение на стратегическия документ се цели оптимизация на бъдещото изпълнение на плана.

Документът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане и следва да служи за основа при извършването на предстоящата последваща оценка на ПИРО, която се очаква да бъде направена през 2028 г.

В процеса на изготвяне на годишния доклад са използвани различни **источници на информация:**

- План за интегрирано развитие на община Харманли за периода 2021-2027 г.;
- Отчети за капиталовите разходи на Общината за 2025 г.;
- Други справки и отчети на Община Харманли;
- Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
- Текуща статистика на НСИ;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);
- Официална интернет страница на Община Харманли;
- Друга информация и данни, предоставени от Община Харманли и експлоатационните дружества.

При изготвянето на настоящия документ следва да се отбележи, че съществуват обективни ограничения по отношение на част от данните, използвани в него. В доклада са използвани последните налични данни от различни институции, като това изрично е упоменато в съответния текст или графика.

Важно е да се уточни, че данните в системата на ИСУН са динамични и е възможно след изготвянето на доклада, те да бъдат променени на базата на актуализации на договорите за БФП. Данните от ИСУН, използвани в доклада, са актуални към 21.05.2026 г.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА

Общите условия за изпълнението на ПИРО, съгласно Закона за регионалното развитие могат да бъдат класифицирани по отношение на факторите, които влияят върху актуализацията на плана. Според чл. 22 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, приет с ПМС 183 от 04.08.2020 г., факторите са:

- съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
- промени в свързаното национално законодателство или в правото на ЕС;
- при съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми, влияещи върху изпълнението на плана;
- при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от Европейския съюз (в този случай се актуализира и програмата за реализиране на плана).

По отношение на икономическите и социални условия изминалата 2025 г. се характеризира с годишна инфлация от 5% (годишната инфлация е за декември 2025 г. спрямо същия месец на предходната година, измерена чрез ИПЦ по данни на НСИ). В края на годината в страната се водеше усилена подготовка за влизането на страната ни в Еврозоната. През 2025 г. въпреки продължаващите военни действия в Украйна и Близкия изток, се наблюдава тенденция за намаляване на миграционния натиск върху страната.

След дълъг период на политическа нестабилност и управление от служебни кабинети, в началото на 2025 г. бе съставено редовно правителство, което остана на власт до края на годината.

Положително е, че след решение на Народното събрание, общините получиха възможността да получават държавни средства за реализацията на местни инфраструктурни проекти. Също така, започнаха да се отварят и различни покани за кандидатстване с проекти в настоящия програмен период, което бе възможност общинските администрации да подадат важни за социално-икономическото развитие на общината проектни предложения.

Друга позитивна новина през 2025 г. е приемането на България и пълноправното ѝ членство в Шенгенското пространство, което създава значително по-благоприятни условия за развитие на бизнеса и улеснява свободното движение на стоки.

Не са настъпили промени в свързаното национално законодателство или правото на ЕС през 2025 г. и в този смисъл ПИРО Харманли 2021-2027 е изготвен и все още отговаря на условията по Закона за регионално развитие и другите актуални, действащи нормативни актове.

По отношение на съществени промени в секторни стратегии и програми, които оказват влияние върху изпълнението на ПИРО, през 2025 г. бе публикуван за обсъждане Социален план за климата на Република България, които обхваща периода 2026-2032 г. С издаването на ПМС 24/08.04.2025 г. се определя организацията и координацията на подготовката на Социалния план за климата на Република България и за определяне на органите и структурите, отговорни за неговата подготовка и управление, и на техните основни функции. Препоръчва се при актуализация на ПИРО да бъдат добавени нови дейности към програмата за реализация на плана, които да бъдат финансирани от Социалния план за климата.

2.1. Демографско развитие

Демографските процеси заемат важно място при анализа на развитието на една територия, тъй като те дават ясна представа за динамиката и жизнеспособността на местното население. Направено е сравнение между последните наличните данни от НСИ за 2024 и 2025 г. За да се открие мястото на общината сред област Хасково, са сравнени стойностите на определени показатели на общинско и областно ниво.

Със 0,6% е намаляло населението в община Харманли през 2025 г. По този показател общината следва общата тенденция за намаляване на населението в област Хасково през отчетната година. Наблюдава се спад на броя на населението във всички възрастови групи, като на областно ниво се откроява същата тенденция. През 2025 г. се отчита и намаляване на дела на под трудоспособното население спрямо общия брой на населението в общината. През отчетната година се регистрира запазване на нивата на раждаемост и спад на нивата на смъртността в община Харманли, в сравнение с предходната 2024 г., с което се повишава и коефициентът на естествен прираст през 2025 г. Коефициентът на механичен прираст през 2025 г. отбелязва значителен спад. Коефициентът на възрастова зависимост, измерващ броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти, нараства с близо 1%. В допълнение, показателят „коефициент на демографско заместване“ показва ръст в съотношението между застаряващото население и населението в трудоспособна възраст. През 2025 г. коефициентът на демографско заместване разкрива, че всеки 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, биват заместени от приблизително 93 „млади“ хора.

Таблица 1. Основни демографски показатели

Показател	Мерна ед.	Община Харманли			Област Хасково		
		2024 г.	2025 г.	Δизм.(%)	2024 г.	2025 г.	Δизм.(%)
Население към 31.12.	брой	22 848	22 716	-0,6	207 356	205 702	-0,8
в под трудоспособна възраст	брой	3 773	3 731	-1,11	31 235	30 798	-1,40
в трудоспособна възраст	брой	13 349	3 297	-0,39	116 698	115 552	-0,98
в над трудоспособна възраст	брой	5 726	5 688	-0,66	59 423	59 352	-0,12
Дял на под трудоспособното население от общото население	%	16,51	16,42	-0,09	15,06	14,97	-0,09
Коефициент на раждаемост	‰	7,62	7,64	+0,3	7,40	7,63	3,1
Коефициент на смъртност	‰	16,38	13,78	-15,9	16,40	16,71	1,9
Коефициент на естествен прираст	‰	-8,76	-6,15	-29,8	-9,00	-9,08	0,9
Коефициент на механичен прираст (вътрешна миграция)	‰	82,27	0,35	-99,6	10,19	1,07	-89,5
Коефициент на възрастова зависимост (отношение между лицата в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) и в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години))	%	61,53	62,48	0,95	66,54	67,59	1,05
Коефициент на демографско заместване (отношение на населението във възрастовата група 15-19 и възрастовата група 60-64)	%	97,88	93,37	-4,51	68,52	70,45	1,92

Източник: по данни на НСИ и собствени изчисления

2.2. Икономическо развитие

Икономическото развитие на община Харманли отразява състоянието и динамиката на местната икономика. Чрез сравнение на данните за 2023 и 2024 г. се проследяват основните промени и тенденции в икономическото развитие на общината.

Икономиката на община Харманли се базира предимно на секторите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Преработваща промишленост“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Броят на предприятията за 2024 г. спрямо 2023 г. е нараснал с 1,5%. Броят на лицата, работещи в тях, е намалял с 4%. По отношение на произведената продукция, същата намалява с 4,2%. По-точният измерител на икономическото развитие са нетните приходи от продажби, при които се отчита спад с 1,7%. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи нарастват с 13,5% за период от една година.

Таблица 2. Ключови икономически показатели

Показател	Мерна ед.	2023 г.	2024 г.	Δ изм. (%)
Брой предприятия	брой	1 471	1 493	+1,5
Заети лица	брой	4 341	4 169	-4,0
Произведена продукция	хил. лв.	324 200	310 671	-4,2
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	538 460	529 099	-1,74
Разходи за придобиване на ДМА	брой	37 160	42 169	+13,5

Източник: по данни на НСИ

2.3. Пазар на труда

През 2025 г. пазарът на труда в община Харманли се характеризира със запазване на нивото на регистрираната безработица. Регистрираните безработни лица са 565. По данни на дирекция „Бюро по труда“ – Харманли сключените договори с работодатели по мерки за насърчаване на заетостта, включително по ПРЧР 2021-2027, са 111. Броят безработни лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта, включително по ПРЧР, са 110. Броят безработни лица, включени в курсове за квалификация и преквалификация, както и заети лица, възползвали се от мерки за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, включително по ПРЧР, са 618. Действащите през отчетната година национални/регионални програми за заетост, на територията на община Харманли, са НП „Активиране на неактивни лица“, НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, НП „Помощ за пенсиониране“, Програма за заетост и обучение на бежанци, НП „Заетост и обучение на продължително безработни лица“ - компонент 1 и компонент 2. Броят младежи и други групи в неравностойно положение, интегрирани на пазара на труда, са 341. Броят търсещи работа лица, които годишно използват услугите на подкрепяните служби по заетостта, са 650. Средната годишна брутна работна заплата за общината през 2024 г. е нараснала с почти 16,7% спрямо предходната година.

Таблица 3. Състояние на пазара на труда

Показател	Мерна ед.	Община Харманли	
		2024 г.	2025 г.
Средна годишна брутна работна заплата	лв.	14 894 (2023 г.)	17 377 (2024 г.)
Заявени свободни работни места	брой	176	183
Коефициент на безработица	%	7,16	7,15

Източник: по данни на НСИ и ДБТ- Харманли

2.4. Социално развитие

През учебната 2025/2026 г. образователната инфраструктура на община Харманли запазва своята устойчивост и осигурява стабилни условия за предоставяне на образователни услуги. На територията на общината функционират 3 детски градини и 9 училища (8 основни и 1 професионална гимназия), като броят им остава непроменен спрямо предходната учебна година. В системата на предучилищното образование броят на обхванатите деца леко се повишава. Положителна тенденция се наблюдава и по отношение на кадровото осигуряване, като броят на детските учители също нараства. Данните показват относителна стабилност на образователната система въпреки неблагоприятните демографски процеси, характерни за много общини в страната. Леко увеличение се наблюдава в броя на учениците, а образователният процес се осъществява от по-голям брой учители, в сравнение с предходната година.

В контекста на област Хасково община Харманли заема значимо място в образователната система, като в нея се обучават близо 10% от всички ученици в областта и функционират 12% от училищата. Делът на децата в детските градини достига почти 29% от общия брой на децата в областта, което подчертава ролята на общината като важен образователен център в региона.

Таблица 4. Ключови показатели в областта на образованието

Показател	Мерна ед.	Община Харманли		Област Хасково
		2024/2025 г.	2025/2026 г.	2025/2026 г.
Детски градини	брой	3	3	36
Децата в детските градини	брой	694	698	2 413
Детски учители в детските градини	брой	58	60	517
Учители	брой	195	198	1 967
Ученици	брой	2 180	2 184	22 079
Ученици в професионални програми	брой	214	213	4 960
Училища	брой	9	9	75

Забележка: От учебната 2024/2025 г. данните за учителите не включват учителите в Центровете за подкрепа за личностно развитие и Центровете за специална образователна подкрепа.

Източник: по данни на НСИ

През разглеждания период се наблюдава относителна стабилност в осигуреността с основни медицински кадри на територията на община Харманли. В общината функционира една многопрофилна болница с 87 легла. Броят на лекарите намалява, като същата тенденция се наблюдава при професионалистите по здравни грижи и другите медицински специалисти. Броят на лекарите по дентална медицина се увеличава. Показателите за осигуреност на населението с медицински специалисти показват по-голяма натовареност на лекарите, но по-малка натовареност на лекарите по дентална медицина. Данните за детските ясли са обновени и към 2025 г. не се наблюдава промяна в броя на детските ясли на територията на община Харманли и местата в тях. Намалява броят на децата, които ги посещават, а освен това намалява и стойността на показателя „Обхват на децата в детските ясли“, който показва отношението на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Таблица 5. Ключови показатели в областта на здравеопазването

Показател	Мерна ед.	Община Харманли		Област Хасково
		2023 г.	2024 г.	2024 г.
Лечебни заведения	брой	1	1	11
Лекари	брой	48	46	617
Лекари по дентална медицина	брой	14	16	203
Професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти	брой	84	78	1 076
Население на един лекар	брой	442,3	496,7	336,1
Население на един лекар по дентална медицина	брой	1 516,3	1 428	1 021,5
Детски ясли	брой	2*	2**	22**
Места в детските ясли	брой	75*	75**	876**
Деца в детските ясли	брой	70*	54**	753**
Обхват на децата в детските ясли	%	12,1*	10,1**	15,4**

Източник: по данни на НСИ

Забележка: * данните са за 2024 г.

Забележка: ** данните са за 2025 г.

През 2025 г. в община Харманли се предлагат редица социални услуги, насочени към подкрепа и подобряване качеството на живот на различни групи от населението. В следващата таблица са представени услугите, капацитетът и броят на потребителите им.

Таблица 6. Социални услуги, капацитетът им и броят потребители към 2025 г.

Социални услуги в общността	Капацитет	Потребители
Асистентска подкрепа	67	67
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания /ЦНСТДУ/	14	12
Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания „Надежда“ /ДЦДПЛУ/	30	38
Дом за стари хора /ДСХ/	40	29
Център за обществена подкрепа /ЦОП/	30	37

Източник: по данни на Община Харманли

3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. по изпълнението на ПИРО Харманли на база на заложените в него индикатори за резултат и индикатори за продукт.

В ПИРО Харманли са определени **индикатори за резултат и индикатори за продукт**. Чрез тях се отчита напредъкът и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината. Данните за наблюдение степента на постигане на съответните цели и приоритети са събрани с помощта на официалните източници на информация, както и чрез обсъждания с представители на Община Харманли.

За постигане на визията на общината в ПИРО са обособени **три стратегически цели**. Техният обхват е обвързан с най-важните сфери за развитие в община Харманли и цели отразяване на местните потенциали за развитие.

Стратегическа цел 1: Повишаване на качеството на живот на местното население, намаляване на социалните неравенства и осигуряване на равен достъп до качествени публични услуги	Стратегическа цел 2: Опазване на околната среда и минимизиране на последствията от климатичните промени	Стратегическа цел 3: Използване на местните ресурси за постигане на ускорен икономически растеж, основан на иновации, технологии и устойчиви земеделски практики
--	---	--

При изготвяне на ПИРО Харманли са обособени **пет приоритета**, които отразяват различни области на действие на общинските политики. Като допълнение към всеки приоритет са описани определени мерки, които имат много по-голяма конкретизация.

Приоритет 1: Укрепване на административния капацитет, изпълнение на общински политики и сътрудничество
Приоритет 2: Социално сближаване, укрепване и развитие на висококвалифициран човешкия капитал
Приоритет 3: Модернизиране на инфраструктурата
Приоритет 4: Приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска, и опазване на околната среда
Приоритет 5: Развитие на иновативна цифрова, кръгова и зелена икономика

3.1. Индикатори за резултат

Проследяването на напредъка по изпълнението на стратегическите цели на ПИРО се осъществява посредством заложените индикатори за резултат. Тяхното значение е съществено при формирането на оценката за ефективността на плана.

Въз основа на извършения анализ могат да се открият следните основни характеристики:

- За отчитане напредъка на **Стратегическа цел 1: Повишаване на качеството на живот на местното население, намаляване на социалните неравенства и осигуряване на равен достъп до качествени публични услуги** са посочени 16 индикатора. Напредък е отчетен по 11 индикатора, като част от целевите стойности са изцяло изпълнени или дори преизпълнени. Положително развитие се наблюдава в областта на дигитализацията на публичните услуги, енергийната ефективност, образователната и здравната инфраструктура. При 4 индикатора не се отчита напредък, като те са свързани с

ширококоловия достъп, велосипедната инфраструктура и подобряването на енергийните характеристики на предприятията. За индикатора „RCR 74 – Годишен брой на лицата, които използват подкрепените съоръжения за социални услуги“ липсват данни и не може да бъде направена оценка на изпълнението.

- За отчитане напредъка на **Стратегическа цел 2: Опазване на околната среда и минимизиране на последствията от климатичните промени** са проследени общо 13 индикатора. Напредък е отчетен по 9 от тях, като се наблюдават положителни резултати в областите на управлението на отпадъците, енергийната ефективност и мерките за адаптация към климатичните промени. Без напредък остават 4 индикатора, свързани основно с енергията от възобновяеми източници, вторичното пречистване на отпадъчни води, намаляване на загубите на вода и изграждането на канализационна инфраструктура.
 - За отчитане напредъка на **Стратегическа цел 3: Използване на местните ресурси за постигане на ускорен икономически растеж, основан на иновации, технологии и устойчиви земеделски практики** са проследени 12 индикатора. Напредък е отчетен при 11 от тях, като се наблюдава много висока степен на изпълнение и приближаване към целевите стойности. При част от показателите целите вече са достигнати или надхвърлени, особено в областите на туризма, културната инфраструктура и съвместните проекти с партньори. Отчетен е един индикатор без напредък, свързан с частните инвестиции, привличащи публична подкрепа, където няма регистрирани стойности спрямо заложената цел.
 - Общо 75,6% от индикаторите имат отчетен напредък. Индикаторите без напредък представляват 22%, а тези, чиито напредък не може да бъде оценен към 2024 г. – 2,4%.
- В **Таблица 7** е представен напредъкът по всички индикатори за резултат.

Таблица 7. Постигнат напредък по индикаторите за резултат на ПИРО към 2025 г.

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
Стратегическа цел 1: Повишаване на качеството на живот на местното население, намаляване на социалните неравенства и осигуряване на равен достъп до качествени публични услуги						
1	RCR 11 — Потребители на нови обществени цифрови услуги и приложения	Община Харманли	бр.	0	147	250
2	RCR 26 — Годишно крайно потребление на енергия (за следните цели: жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)	Община Харманли	% ↓	0	64	5
3	RCR 27 — Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите жилища	Община Харманли	бр.	0	3	200
4	RCR 28 — Сгради с подобрена енергийна класификация (жилищни, частни нежилищни, обществени нежилищни)	Община Харманли	бр.	0	1	15
5	RCR 29 — Очаквани емисии на парникови газове*	Община Харманли	% ↓	0	2	5
6	RCR 30 — Предприятия с подобрени енергийни характеристики	Община Харманли	бр.	0	0	10
7	RCR 53 — Домакинства с абонаменти за ширококолов пътен достъп до мрежа с много висок капацитет	Община Харманли	бр.	0	0	200
8	RCR 54 — Предприятия с абонаменти за ширококолов пътен достъп до мрежа с много висок капацитет	Община Харманли	бр.	0	0	10
9	RCR 55 — Ползватели на новоизградени, реконструирани или модернизирани пътища	Община Харманли	бр.	0	18 000	18 000
10	RCR 64 — Годишен брой на лицата, използващи специално предназначения велосипедна инфраструктура	Община Харманли	бр.	0	0	200

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
11	RCR 65 — Търсещи работа лица, които използват годишно услугите на подкрепяните служби по заетостта	Община Харманли, Бюро по труда	бр.	0	111 договора	50
12	RCR 70 — Годишен брой на децата, използващи подкрепяната инфраструктура за грижи за деца	Община Харманли	бр.	0	87	636
13	RCR 71 — Годишен брой на децата, използващи подкрепяната образователна инфраструктура	Община Харманли	бр.	0	2 750	1 600
14	RCR 72 — Лица с достъп до подобрени здравни услуги	Община Харманли; „МБАЛ - Харманли“ ЕООД	бр.	0	60	200
15	RCR 73 — Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните здравни заведения	Община Харманли; „МБАЛ - Харманли“ ЕООД	бр.	0	200	200
16	RCR 74 — Годишен брой на лицата, които използват подкрепяните съоръжения за социални грижи	Община Харманли, АСП	бр.	0	147	44
Стратегическа цел 2: Опазване на околната среда и минимизиране на последствията от климатичните промени						
17	RCR 31 — Общо произведена енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)	Община Харманли	MW	0	23,90	1 MW
18	RCR 32 — Енергия от възобновяеми източници: капацитет, свързан към мрежата (оперативен)	Община Харманли	MW	0	0	0,1 MW
19	RCR 35 — Жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Община Харманли	бр.	0	22 800 изпълнено	18 000
20	RCR 36 — Жители, които се ползват от мерки за защита от горски пожари	Община Харманли	бр.	0	22 800 изпълнено	850
21	RCR 41 — Жители, свързани към подобрени системи за снабдяване с вода	Община Харманли	бр.	0	1 200 изпълнено	800

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
22	RCR 42 — Жители, свързани поне към системи за вторично пречистване на отпадъчни води	Община Харманли	бр.	0	0	18 000
23	RCR 43 — Загуби на вода	Община Харманли, ВиК Хасково	% ↓	0	71,31%	10
24	RCR 44 — Адекватно третирани отпадъчни води	Община Харманли, ВиК Хасково	л/с	0	0	185 л/с
25	RCR 46 — Жители, обслужвани от съоръжения за рециклиране на отпадъци и малки системи за управление на отпадъци	Община Харманли, „Екоресурс Харманли“ ЕООД	бр.	0	20 000 изпълнено	20 000
26	RCR 47 — Рециклирани отпадъци	Община Харманли, „Екоресурс Харманли“ ЕООД	т	0	200т. изпълнено	21
27	RCR 48 — Рециклирани отпадъци, използвани като суровини	Община Харманли, „Екоресурс Харманли“ ЕООД	т	0	200т. изпълнено	5
28	RCR 50 — Жители, които се ползват от мерки по отношение на качеството на въздуха	Община Харманли	бр.	0	18 000 изпълнено	1 800
29	RCR 95 — Жители, които имат достъп до нова или модернизирана зелена инфраструктура в градските райони	Община Харманли	бр.	0	18 000 изпълнено	1 800
Стратегическа цел 3: Използване на местните ресурси за постигане на ускорен икономически растеж, основан на иновации, технологии и устойчиви земеделски практики						
30	RCR 01 — Работни места, създадени в подкрепяните структури	Община Харманли, АМСП, Агенция по заетостта	бр.	0	19 и 111 дог. ДБТ	100
31	RCR 02 — Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа (безвъзмездни средства, финансови инструменти)*	Община Харманли, МСП, АМСП	хил. лв.	0	0	3 000

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
32	RCR 14 — Предприятия, които използват публични цифрови услуги*	Община Харманли	бр.	0	6	80
33	RCR 77 — Туристи/посещения в подпомогнатите обекти	Община Харманли, ИМ - Харманли	бр.	0	2 500	2 800
34	RCR 78 — Ползватели на подкрепяната културна инфраструктура	Община Харманли, Читалища	бр.	0	1 200	800
35	RCR 79 — Съвместни стратегии/планове за действие, предприети от организации при/след приключването на проект	Община Харманли, Партньори	бр.	0	1	1
36	RCR 80 — Съвместни пилотни дейности, предприети/усъвършенствани от организации при/след приключването на проект	Община Харманли, Партньори	бр.	0	1	1
37	RCR 81 — Участници, които приключват съвместни схеми за обучение	Община Харманли, Партньори	бр.	0	9	20
38	RCR 83 — Лица, обхванати от подписаните съвместни споразумения	Община Харманли, Партньори	бр.	0	17	40
39	RCR 84 — Организации, които осъществяват трансгранично сътрудничество 6-12 месеца след приключването на проект	Община Харманли, Партньори	бр.	0	2	2
40	RCR 85 — Участници в съвместни действия 6-12 месеца след приключването на проект	Община Харманли, Партньори	бр.	0	10	20
41	RCR 86 — Заинтересовани страни/институции с повишен капацитет за трансгранично сътрудничество	Община Харманли, Партньори	бр.	0	2	2

Източник: по данни на ПИРО Харманли, Общинска администрация, НСИ, собствени изчисления

3.2. Индикатори за продукт

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на определените приоритети за развитие на общината. Индикаторите за продукт, заложи в ПИРО, са систематизирани по приоритетните направления и мерки в плана.

Въз основа на извършения анализ могат да се открият следните основни характеристики:

- Напредък се отчита по всички индикатори, заложи към **Приоритет 1: Укрепване на административния капацитет, изпълнение на общински политики и сътрудничество**. По *Мярка 1.1* се наблюдава добро изпълнение на дейностите, насочени към укрепване на капацитета на общинската администрация и реализиране на стратегически политики. По *Мярка 1.2* се отчита устойчив напредък в областта на обучението на служителите, приемствеността в администрацията и дигиталната трансформация. По *Мярка 1.3* се наблюдава много добро изпълнение на заложените дейности. Постигнатите резултати създават добра основа за изпълнение на заложените целеви стойности до края на програмния период.
- По-голямата част от индикаторите към **Приоритет 2: „Социално сближаване, укрепване и развитие на висококвалифициран човешки капитал“** през 2025 г. отчитат положително развитие и значителен напредък по отношение на заложените целеви стойности. По *Мярка 2.1* се отчита напредък по отношение на интеграцията на младежите на пазара на труда, предоставянето на услуги за професионално ориентиране и при консултирането и насочването на търсещи работа лица, като отчетените стойности значително надвишават заложените цели. По *Мярка 2.2* се наблюдават добри резултати по отношение на предоставянето на социални услуги за деца, младежи, възрастни хора и лица с увреждания, както и при услугите за подкрепа в общността и дълготрайната грижа за нуждаещите се лица и подобряването на социалната инфраструктура. По *Мярка 2.3* се отчита висока степен на изпълнение. По *Мярка 2.4* се отчита напредък в подобряването на здравната инфраструктура и осигуряването на медицински специалисти, а по *Мярка 2.5* са реализирани множество инициативи за здравна профилактика и повишаване на здравната култура на населението. По *Мярка 2.6* и *Мярка 2.7* продължава модернизацията на образователната инфраструктура и учебната среда, включително чрез внедряване на STEM кабинети и иновативни образователни практики. добри резултати се наблюдават по *Мярка 2.8*, свързана с ученето през целия живот, където отчетените стойности многократно надвишават заложените цели. По *Мярка 2.9* се отчита устойчиво развитие на културните, младежките и спортните дейности, като част от индикаторите вече са изпълнени или надхвърлят планираните стойности.
- По-голямата част от индикаторите към **Приоритет 3: „Модернизиране на инфраструктурата“** през 2025 г. отчитат напредък в изпълнението. По *Мярка 3.1* се наблюдава частичен напредък по отношение на подобряването на водоснабдителната инфраструктура. По *Мярка 3.2* се отчитат добри резултати при подобряването на транспортната свързаност. По *Мярка 3.3* се наблюдава устойчив напредък в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. По *Мярка 3.4* се отчита изпълнение на дейностите, свързани с повишаването на киберсигурността в общинската администрация.
- По-голямата част от индикаторите към **Приоритет 4: „Приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска и опазване на околната**

среда“ през 2025 г. отчитат напредък в изпълнението, като при част от тях заложените целеви стойности са достигнати или надхвърлени. По *Мярка 4.1* се наблюдава добро изпълнение на дейностите, свързани с превенцията на риска от наводнения и поддържането на водните обекти на територията на общината. По *Мярка 4.2* се отчита добър напредък в управлението на отпадъците. По *Мярка 4.3* се наблюдава устойчив напредък по отношение подобряването на качеството на атмосферния въздух. По *Мярка 4.4* се отчита напредък при дейностите за опазване на биоразнообразието, зелената система и горските територии.

- По-голямата част от индикаторите към **Приоритет 5: „Развитие на иновативна цифрова, кръгова и зелена икономика“** през 2025 г. отчитат напредък, като при част от тях заложените целеви стойности са достигнати или надхвърлени. По *Мярка 5.1* се наблюдава частичен напредък в развитието на бизнес инфраструктурата и подготовката на условия за привличане на инвестиции. По *Мярка 5.2* се отчита напредък в създаването на подкрепяща среда за развитие на бизнеса чрез провеждане на срещи с представители на бизнеса и предоставяне на информация за възможностите за финансиране. По *Мярка 5.3* се наблюдават положителни резултати в подкрепа на земеделските производители и развитието на местните пазари. По *Мярка 5.4* се отчита добър напредък в развитието на туристическия потенциал на общината. По *Мярка 5.5* се наблюдава добро изпълнение на дейностите за съхраняване на местната културна идентичност. По *Мярка 5.6* се отчита напредък в туристическия маркетинг и популяризирането на общината като туристическа дестинация.
- Общо 86% от индикаторите за продукт имат отчетен напредък. Индикаторите без напредък представляват 12,3%, а тези, чиито напредък не може да бъде оценен към 2025 г. – 1,8%.

В **Таблица 8** е представен напредъкът по всички индикатори за продукт.

Таблица 8. Постигнат напредък по индикаторите за продукт на ПИРО към 2025 г.

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
Приоритет 1: Укрепване на административния капацитет, изпълнение на общински политики и сътрудничество						
Мярка 1.1. Стратегическо планиране и изпълнение на общински политики						
1	Подобряване на капацитета на общинската администрация за подготовка, изпълнение и отчитане на ПИРО и други стратегически документи	Брой служители с повишен капацитет за подготовка, изпълнение и отчитане на ПИРО и други стратегически документи	бр.	Община Харманли	13	25
2	Формулиране и реализация на общински политики в областта на екологията, образованието, икономиката, енергетиката, социалната политика и социалните услуги и др.	RCO 74 — Жители, обхванати от стратегии за интегрирано градско развитие	бр.	Община Харманли	10 000	18 000
3	Подготовка на нова стратегия за BOMP	RCO 80 — Водени от общностите стратегии за местно развитие	бр.	Община Харманли, ДФЗ - РА, МИГ - Харманли	1	1
Мярка 1.2. Повишаване на административния капацитет на общинска администрация						
4	Подобряване на квалификацията и професионалната компетентност на служителите	Брой служители , участвали в обучения за повишаване на квалификацията	бр.	Община Харманли, НСОРБ	11	50
5	Осигуряване на приемственост между служителите в общинска администрация	Брой нови служители, получили менторска и наставническа помощ	бр.	Община Харманли, НСОРБ	6	10
6	Доизграждане на единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) чрез изграждане на нова пасивна инфраструктура	RCO 14 — Публични институции, получаващи подкрепа за разработване на цифрови услуги и приложения	бр.	Община Харманли, ИСУН	изпълнено	1

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
7	Информационно осигуряване на процесите на управление и функциониране на информационната система за управление на общината	RCO 14 — Публични институции, получаващи подкрепа за разработване на цифрови услуги и приложения	бр.	Община Харманли, ИСУН	1	1
8	Пълна дигитализация на документалния архив, съхраняван безсрочно	RCO 13 — Цифрови услуги и продукти, разработени за предприятията	бр.	Община Харманли	1	3
9	Обновяване на технологичното оборудване в структурата на общинска администрация, общински предприятия и др.	RCO 14 — Публични институции, получаващи подкрепа за разработване на цифрови услуги и приложения	бр.	Община Харманли	изпълнено	1
10	Софтуерно осигуряване администрацията	RCO 14 — Публични институции, получаващи подкрепа за разработване на цифрови услуги и приложения	бр.	Община Харманли	1	1
11	Разширяване обхвата на предоставяните електронни услуги и публични регистри	RCO 13 — Цифрови услуги и продукти, разработени за предприятията	бр.	Община Харманли	1	3
Мярка 1.3. Териториално и трансгранично сътрудничество						
12	Планиране на интегрираните териториални инвестиции с общините от област Хасково и ЮЦР	RCO 76 — Съвместни проекти	бр.	Община Харманли, ИСУН	3	5
13	Партньорство при подготовката, изпълнението и управлението на интегрираните териториални инвестиции с общините от област Хасково и ЮЦР	RCO 76 — Съвместни проекти	бр.	Община Харманли, ИСУН	2	5
14	Сътрудничество с институции от трансграничните райони в България, Гърция и Турция и др. страни	RCO 87 — Организации, осъществяващи трансгранично сътрудничество	бр.	Община Харманли, ИСУН	изпълнено	5

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
15	Партньорство при подготовката, изпълнението и управлението на проекти с институции от трансграничните райони в България, Гърция и Турция и др. страни	RCO 84 — Съвместни пилотни дейности, изпълнявани по проекти	бр.	Община Харманли, ИНТЕРРЕГ	3	5
		RCO 85 — Участници в съвместни схеми за обучение	бр.		20	20
		RCO 88 — Трансгранични проекти за партньорско обучение с цел засилване на дейностите за сътрудничество	бр.		2	3
Приоритет 2: Социално сближаване, укрепване и развитие на висококвалифициран човешки капитал						
Мярка 2.1 Подобряване на достъпа до трудова заетост						
16	Намаляване процента неактивни лица в общината	RCO 61 — Годишен брой на безработните лица, обслужвани чрез подобрени съоръжения на службите по заетостта (капацитет)	%	Община Харманли, Бюро по труда - Харманли, АЗ	НИ	10
17	Интегриране на младежи и други групи в неравностойно положение на пазара на труда	Увеличаване на броя на младежите, интегрирани на пазара на труда	%	Община Харманли, Бюро по труда - Харманли, АЗ	3	5
18	Подобряване баланса между отделните социални групи и осигуряване на равенство на пазара на труда	RCO 82 — Участници в съвместни действия за насърчаване на равенството между половете, равните възможности и социалното приобщаване	бр.	Община Харманли, Бюро по труда - Харманли, АЗ	НИ	50
19	Професионално ориентиране	RCO 101 — МСП, инвестиращи в развитие на уменията	бр.	Община Харманли, Бюро по труда - Харманли, АЗ	227 консултирани	30

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
Мярка 2.2 Социално сближаване и равни възможности						
20	Подкрепящи услуги в общността за деца и младежи	RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)	бр.	Община Харманли	72	35
21	Услуги за осигуряване на подслон и подкрепа на бездомни лица	RCO 63 — Капацитет на създадената временна инфраструктура за настаняване	бр.	Община Харманли	0	14
22	Дълготрайна грижа за лица с трайни увреждания и възрастни	RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)	бр.	Община Харманли	289	40
23	Подобряване на социалната инфраструктура	RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)	бр.	Община Харманли	29	44
24	Подкрепа на лица, жертви на насилие	RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)	бр.	Община Харманли	0 лица над 18г. и 3 до 18 г.	14
25	Интегрирана здравно-социална услуга за стари хора от резидентен тип	RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)	бр.	Община Харманли	0	30
Мярка 2.3 Оказването на подкрепа за нуждаещите се						
26	Оказване на подкрепа от първа необходимост за нуждаещите се	RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)	бр.	Община Харманли	560	350

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
27	Топъл обяд	RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)	бр.	Община Харманли	200	247
28	Детска кухня	RCO 70 — Капацитет на подкрепяната социална инфраструктура (различна от жилищна)	бр.	Община Харманли	780 деца	600
Мярка 2.4 Подобряване на качеството на предоставяните здравни услуги						
29	Обновяване на сградния фонд	RCO 69 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура за здравни грижи	бр. легла	Община Харманли, МБАЛ Харманли, ДКЦ и здр. служби	87	100
30	Технологично обновяване на сградния фонд	RCO 69 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура за здравни грижи	бр. легла	Община Харманли, МБАЛ Харманли, ДКЦ и здр. служби	87	100
31	Привличане на медицински специалисти в общината	Брой привлечени медицински специалисти	бр.	Община Харманли, МБАЛ Харманли, ДКЦ и здр. служби	3	2
32	Развитие на телездравеопазване - Медицинска практика от разстояние	Брой медицински практики от разстояние	бр.	Община Харманли, МБАЛ Харманли, ДКЦ и здр. служби	1	10
Мярка 2.5 Превенция на здравето и повишаване здравната култура						
33	Повишаване на здравната култура на населението	Брой проведени кампании	бр.	Община Харманли, МБАЛ Харманли, ДКЦ и здр. служби	16	7
34	Повишаване на здравната информираност на населението	Брой проведени кампании	бр.	Община Харманли, МБАЛ Харманли, ДКЦ и здр. служби	16 и 9 бр. брошури	7

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
35	Подобряване здравното състояние на уязвимите групи в общината	Брой профилактични прегледи	бр.	Община Харманли, МБАЛ Харманли, ДКЦ и здр. служби	178	210
Мярка 2.6 Подобряване на образователната инфраструктура						
36	Основен ремонт на детските градини и училищата, физкултурните им салони и открити детски площадки и прилежащите им дворни пространства и инфраструктура	RCO 66 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната инфраструктура за грижи за деца (нови или модернизирани) RCO 67 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)	бр.	Община Харманли, Училища и детски градини	3 бр. и капацитет 526 ученика	1 600
37	Подмяна на обзавеждането на детските градини и училищата	RCO 66 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната инфраструктура за грижи за деца (нови или модернизирани) RCO 67 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)	бр.	Община Харманли, Училища и детски градини	4 бр. и капацитет 591 ученика	1 600
38	Технологично обновяване на училищата	RCO 66 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната инфраструктура за грижи за деца (нови или модернизирани) RCO 67 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)	бр.	Община Харманли, Училища и детски градини	4 училища/ 591 деца	1 600

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
Мярка 2.7 Качествено образование за всеки						
39	Повишаване качеството и подобряване достъпа до образование	RCO 16 — Заинтересовани страни, участващи в процеса на опознаване на сферата на предприемачеството	бр.	Община Харманли	7	20
40	Изграждане на училищна STEM среда	RCO 67 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)	бр.	Община Харманли	6 бр. STEM	10
41	Модернизация на учебния процес	RCO 67 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)	бр.	Община Харманли	4 бр. училища и 250 деца	400
42	Подкрепа за иновативни детски градини и училища	RCO 67 — Капацитет на класните стаи на подкрепяната образователна инфраструктура (нови или модернизирани)	бр.	Община Харманли	3 училища	10
Мярка 2.8 Учене през целия живот						
43	Професионална квалификация и преквалификация	RCO 101 — МСП, инвестиращи в развитие на уменията	бр.	Община Харманли, Бюро по труда	618 обучени	20
44	Иновативни форми за учене	RCO 101 — МСП, инвестиращи в развитие на уменията	бр.	Община Харманли, Бюро по труда	111 скл. дог.	20
Мярка 2.9 Развитие на културата, спорта и младежките дейности						
45	Развитие на културата	RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли, Читалища, БПЦ	400	800

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
46	Развитие на младежките дейности	RCO 16 — Заинтересовани страни, участващи в процеса на опознаване на сферата на предприемачеството	бр.	Община Харманли, Читалища, БПЦ	6	10
47	Развитие на спорта и местата за отдих	Бр. подкрепени площадки за отдих и спорт в населените места от общината	бр.	Община Харманли	12	10
Приоритет 3: Модернизиране на инфраструктурата						
Мярка 3.1. Модернизиране на ВиК инфраструктурата						
48	Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейните води.	RCO 30 — Дължина на новите или консолидираните тръби за битови нужди	км	ВиК - Хасково, Община Харманли	1 325 м	23
49	Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейните води.	RCO 30 — Дължина на новите или консолидираните тръби за битови нужди	бр.	ВиК - Хасково, Община Харманли	1 325 м	1 бр. ПСПВ
50	Подобряване на канализационната инфраструктура и пречистването на отпадни води от бита и промишлеността.	RCO 31 — Дължина на мрежите за събиране на отпадъчни води, новоизградени или консолидирани	км	ВиК - Хасково, Община Харманли	0	30
51	Подобряване на канализационната инфраструктура и пречистването на отпадни води от бита и промишлеността.	RCO 32 — Нов или подобрен капацитет за пречистване неотпадъчни води	бр.	ВиК - Хасково, Община Харманли	0	1 бр. нова ПСОВ
Мярка 3.2. Подобряване на транспортната свързаност						
52	Подобряване на транспортната свързаност чрез републиканска пътна мрежа	RCO 46 — Дължина на реконструирани или модернизираните пътища — други	км	Община Харманли	2	3

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
53	Подобряване на транспортната свързаност чрез общинската пътна мрежа	RCO 46 — Дължина на реконструирани или модернизиращи пътища — други	км	Община Харманли	2	10
54	Ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населените места в община Харманли	RCO 46 — Дължина на реконструирани или модернизиращи пътища — други	км	Община Харманли	170	20
55	Разширяване мрежата от велоалеи в община Харманли	RCO 58 — Подкрепяна велосипедна инфраструктура	км	Община Харманли	60	3
Мярка 3.3. Подобряване на енергийна ефективност						
56	Саниране на основните публични сгради (административни сгради, социални центрове и услуги, здравни учреждения, училища и детски градини, читалища и др.).	RCO 19 — Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на енергийните им характеристики	бр.	Община Харманли	2	5
57	Подмяна на топлинни и охлаждащи системи в публични сгради с такива с по-ниско енергопотребление.	RCO 19 — Обществени сгради, получили подкрепа за подобряване на енергийните им характеристики	бр.	Община Харманли	2	5
58	Подмяна на външното изкуствено осветление с енергоефективно и такова базирано на ВЕИ	RCO 19 — Обществени съоръжения, получили подкрепа за подобряване на енергийните им характеристики	бр.	Община Харманли	170	300
59	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в частни еднофамилни и многофамилни жилищни сгради на територията на община Харманли.	RCO 18 — Домакинства, получили подкрепа за подобряване на енергийните характеристики на жилището си	бр.	Община Харманли	60	200
60	Изграждане на общински соларен парк за задоволяване на собствени нужди на общината.	RCO 22 — Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (електроенергия, топлинна енергия)	бр.	Община Харманли, НСИ	1	1

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
61	Подпомагане изграждането и използване на ВЕИ за производствени, земеделски и битови нужди	RCR 30 — Предприятия с подобрени енергийни характеристики	бр.	МСП	17 ФЕЦ	10
Мярка 3.4. Подобряване на електронната съобщителна мрежа и свързаност						
62	Изграждането на общинска лъчеобразна система от многоленов интернет - обхващащ с рационално изградени трасета „опорните села”	RCO 41 — Допълнителен брой домакинства с широколенов достъп с много голям капацитет; RCO 42 — Допълнителен брой предприятия с широколенов достъп с много голям капацитет	бр.	Община Харманли	0	500
63	Изграждане на обществени зони със свободен достъп до Интернет в населените места с над 500 души население	RCO 41 — Допълнителен брой домакинства с широколенов достъп с много голям капацитет	бр.	Община Харманли	0	200
64	Обезпечаване на високо ниво на киберсигурност	RCO 14 — Публични институции, получаващи подкрепа за разработване на цифрови услуги и приложения	бр.	Община Харманли	изпълнено	1
Приоритет 4: Приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска, и опазване на околната среда						
Мярка 4.1. Интегрирано управление на водите и превенция на риска от наводнения						
65	Периодични проверки на техническото състояние на язовирите и коритата на реките, на санитарно-охранителните зони на действащите водоизточници	RCO 24 — Нови или усъвършенствани системи за наблюдение на бедствия, за готовност и за предупреждение и реагиране*	бр.	Община Харманли	90 язовира, 1 дере	1
66	Почистване и корекция на коритата на реките в рамките на урбанизираната територия на населените места (ангажимент на общината) и извън урбанизираната територия на общината	RCO 24 — Нови или усъвършенствани системи за наблюдение на бедствия, за готовност и за предупреждение и реагиране*	бр.	Община Харманли	53 бр. язовири/ 2 проверки	1

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
67	Повишаване на капацитета за реакция при наводнения на общинската администрация и доброволните отряди и подобряване на реакциите на населението при наводнения	RCO 25 — Новопостроени или консолидирани защитни съоръжения по крайбрежни ивици, речни и езерни брегове и свлачища за защита на хора, активи и естествената околна среда	бр.	Община Харманли	1 обучение	1
68	Подобряване на водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии	RCO 26 — Зелена инфраструктура, изградена с цел приспособяване към изменението на климата	бр.	Община Харманли	0	1
Мярка 4.2. Управление на отпадъците						
69	Предотвратяване образуването на нерегламентирани площадки за отпадъци	RCO 27 — Национални/регионални/местни стратегии за приспособяване към изменението на климата	бр.	Община Харманли, РИОСВ - Хасково	10	5
70	Подготовка за извеждане от експлоатация и рекултивация на РДНО - Харманли (или клетки от него) след запълване на неговия капацитет и създаване на проектна готовност за откриване на нови клетки на депото	RCO 27 — Национални/регионални/местни стратегии за приспособяване към изменението на климата	бр.	Община Харманли, РИОСВ - Хасково	1 изпълнена	1
71	Подобряване на организацията и ефективността на сметосъбирането	RCO 27 — Национални/регионални/местни стратегии за приспособяване към изменението на климата	бр.	Община Харманли	1	1
72	Изграждане и оборудване на площадка за съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци	RCO 34 — Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	бр.	Община Харманли, РИОСВ - Хасково	0	1

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
73	Разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци	RCO 34 — Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	бр.	Община Харманли	1	1
74	Повишаване обществената информираност относно практиките на устойчивото потребление, кръговата икономика и ресурсната ефективност	RCO 27 — Национални/регионални/местни стратегии за приспособяване към изменението на климата	бр.	Община Харманли, РИОСВ - Хасково	5	1
Мярка 4.3. Подобряване качеството на атмосферния въздух						
75	Подмяна на индивидуални отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на отопление	Брой подменени индивидуални отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на отопление	бр.	Община Харманли, НСИ	60	120
76	Насърчаване използването на електроавтомобили в централната градска част на гр. Харманли	RCO 59 — Подкрепяна инфраструктура за алтернативни горива (пунктове за зареждане)	бр.	Община Харманли, НСИ	1	2
77	Подмяна на ППС и специализираните автомобили на общинска администрация, общински структури и общинските предприятия с електромобили или хибридни автомобили	Брой закупени електромобили или хибридни автомобили	бр.	Община Харманли	1	3
78	Мониторинг на качеството на атмосферния въздух	RCO 39 — Инсталирани системи за мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух	бр.	Община Харманли	изпълнено	1
79	Образователна и рекламно-информационна кампании за качеството на атмосферния въздух	Брой проведени кампании	бр.	Община Харманли	8	7
80	Стимулиране и подкрепа на МСП за въвеждане на системи за пречистване на въздуха в потенциално замърсяващи производства.	Брой предприятия	бр.	Община Харманли, РИОСВ - Хасково	1	2

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
Мярка 4.4. Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие						
81	Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие в защитени територии по реда на Закона за защитените територии	RCO 37 — Площ на защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки за опазване и възстановяване в съответствие с рамката за приоритетни действия	дка	Община Харманли, РИОСВ - Хасково	9	20
81	Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие в Защитени зони за опазване на дивите птици на територията на община Харманли	RCO 99 — Площ извън защитените зони по „Натура 2000“, обхванати от мерки за опазване и възстановяване	дка	Община Харманли, РИОСВ - Хасково	25	50
83	Подобряване на качеството и възстановяване на зелените системи на община Харманли	RCO 36 — Повърхностна площ на подкрепяната зелена инфраструктура в градските райони	дка	Община Харманли, РИОСВ - Хасково	80	100
84	Подобряване на благосъстоянието на горския фонд	RCO 28 — Зони, обхванати от мерки за защита срещу горски пожари	ха	Община Харманли	25	6 010,8
85	Превенция и защита на екосистемите от засушавания и пожари	RCO 28 — Зони, обхванати от мерки за защита срещу горски пожари	ха	Община Харманли	2 000	6 010,8
Приоритет 5: Развитие на иновативна цифрова, кръгова и зелена икономика						
Мярка 5.1. Изграждане на модерна бизнес инфраструктура и инвестиционен профил						
86	Разработване на „Бизнес профил на община Харманли“, съдържащ подробна и актуална информация, насочена към потенциалните инвеститори				няма	

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
87	Обновяване на довеждаща и съпътстваща инфраструктура за развитие на промишлените зони и създаване на условия за тяхното развитие	RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа	бр.	Община Харманли, НСИ	1	10
88	Подготвяне на терени за привличане на инвеститори	RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа	бр.	Община Харманли, НСИ	0	5
Мярка 5.2. Изграждане на подкрепяща среда за развитие на устойчив и иновативен бизнес						
89	Провеждане на редовни срещи с бизнеса и земеделските производители с цел обмен на информация и добри практики	Брой проведени срещи с бизнеса	бр.	Община Харманли	4 МИГ	7
90	Информирание на бизнеса за възможностите за финансиране на бизнес идеи и проекти по европейски програми от фондове на ЕС от уеб-страницата на общината и електронния бюлетин	RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа	бр.	Община Харманли, НСИ	15	80
91	Модернизиране на общинските предприятия и дружества	RCO201 — Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия)*	бр.	Община Харманли	2	4
92	Създаване и развитие на иновативен клъстер „хранително-вкусова промишленост“.	RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа	бр.	Община Харманли	0	20
93	Подкрепа за инвестиции, насочени към въвеждане на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения в МСП	RCO 12 — Предприятия, получаващи подкрепа за цифровизиране на своите продукти и услуги	бр.	Община Харманли, НСИ	2 МИГ и 7 ОП	20

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
94	Подкрепа за технологично обновяване на МСП	RCO201 — Предприятия, получаващи подкрепа (микро-, малки, средни и големи предприятия)*	бр.	Община Харманли, ИСУН	0	25
Мярка 5.3. Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на земеделието и подкрепа за земеделските стопани						
95	Създаване и развитие на поливните системи за земеделските земи чрез използването на автоматизирани системи	RCO 26 — Зелена инфраструктура, изградена с цел приспособяване към изменението на климата	км	Община Харманли, Напоителни системи АД	0	24
96	Модернизиране на общинските пазари в община Харманли.	RCO 02 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства*	бр.	Община Харманли	изпълнено	1
97	Изграждане на регионална борса/тържище за реализиране на земеделска продукция на производители от общините Любимец, Харманли, Свиленград и др. съседни общини	RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа*	бр.	Общините Любимец, Харманли, Свиленград и др. съседни общини	25	45
98	Осигуряване на подкрепа за технологична модернизация на земеделските производители	RCO 02 — Предприятия, получаващи подкрепа чрез безвъзмездни средства*	бр.	Община Харманли, МИГ Харманли	0	15
99	Стимулиране развитието на биоизземеление и успешни земеделски практики	RCO 04 — Предприятия, получаващи нефинансова подкрепа*	бр.	Общините Любимец, Харманли, Свиленград и др. съседни общини	5	10
Мярка 5.4. Създаване на туристическа дестинация „Харманли“ и регионални туристически продукти						
100	Подобряване на административния капацитет за капитализиране и управление на туристическите ресурси	Брой лица преминали специализирани обучения	бр.	Община Харманли	5	15

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
101	Създаване на актуална база данни за състоянието на културно-историческото и природното наследство на Община Харманли	Брой създадени бази данни	бр.	Община Харманли	изпълнено	1
102	Проучване, опазване, реставрация и социализация на културно-историческо наследство на траките	RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли, Общини от ЮЦР	250	700
103	Проучване, опазване, реставрация и социализация на културно-историческо наследство на римляните	RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли, Общини от ЮЦР	150	250
104	Проучване, опазване, реставрация и социализация на културно-историческо наследство от Средновековието	RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли, Общини от ЮЦР	130	250
105	Проучване, опазване, реставрация и социализация на културно-историческо наследство от Възраждането	RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли, Общини от ЮЦР	320	700
106	Обновяване на музейната експозиция на ИМ - Харманли	RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли, Общини от ЮЦР	330	700
107	Създаване на екопътеки на територията на община Харманли	RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли	изпълнено	200
108	Създаване на интегриран туристически продукт за винен туризъм	RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли, Общини от ЮЦР	изпълнено	700
Мярка 5.5. Съхраняване и развитие на културата и местната идентичност						
109	Съхраняване на нематериалното и живото наследство	Брой документиран обекти на нематериалното и живото наследство	бр.	Община Харманли, ИМ - Харманли	4	10

*Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли 2021-2027 г.
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.*

№	Дейност/проектна идея	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Годишна стойност	Целева стойност (2027 г.)
110	Подкрепа на културната, възпитателната и образователната дейност на читалищата	Брой подкрепени самодейци RCO 77 — Капацитет на подкрепяната инфраструктура в областта на културата и туризма	бр.	Община Харманли, Читалища	200	200
111	Подкрепа за провеждането на традиционни и нови фестивали	Брой подкрепени фестивали	бр.	Община Харманли, Читалища, НПО	6 (изпълнено)	5
Мярка 5.6. Туристически маркетинг						
112	Туристическа информация и реклама, участие на туристически борси и изложения	Брой проведени рекламни кампании	бр.	Община Харманли	изпълнено	7
113	Взаимодействие на общината с туристически сдружения и организацията за управление на туристическата дестинация и туристическия район	Брой съвместни срещи между администрацията, бизнеса и НПО, работещи в сферата на туризма	бр.	Община Харманли	4	7

Източник: по данни на ПИРО Харманли, Общинска администрация, НСИ и собствени изчисления

4. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

Съгласно чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие годишните доклади включват в себе си информация за действията, предприети от компетентните органи за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана. Те включват следните компоненти:

- мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през годината, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
- мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана;
- мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
- мерки за прилагане принципа на партньорство;
- резултати от извършени оценки към края на съответната година.

Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Основната мярка за наблюдение изпълнението на ПИРО е чрез предвидените в Закона за регионално развитие инструменти за това – годишни доклади, междинна оценка, последваща оценка.

Действащите механизми за събиране, обработване и анализ на данните са предопределени от източниците на официална информация у нас, както и механизмите за нейното получаване. В този смисъл формалният механизъм може да се обобщи в следните четири стъпки (дейности):

- съставяне на списък с необходимата информация за изготвяне на годишния доклад и/или междинна/последваща оценка;
- подготовка и изпращане на официални писма до съответните институции с искане за информация и данни;
- след получаване на информацията – систематизиране в единна база данни за целите на доклада/оценката;
- обработка на систематизираните данни и оформяне на резултатите от извършените анализи с тях.

Проблеми, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО и мерки за преодоляването им

През 2025 г. не са констатирани съществени затруднения в процеса на изпълнение на ПИРО. Идентифицираните предизвикателства са предимно с външен за община Харманли характер. През отчетния период се запази инфлационният натиск в страната, съпроводен с устойчиво нарастване на цените на основни стоки и услуги. В края на годината се наблюдава засилена политическа нестабилност и нарастване на общественото недоволство. Паралелно с това бе иницииран процесът по присъединяване към еврозоната, с целева дата 01.01.2026 г.

Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана

Още с изготвянето на ПИРО е разработена и комуникационна стратегия към него. В нея са описани методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни както в хода на изготвянето на плана, така и при последващата му реализация.

В допълнение, ПИРО е публикуван на сайта на Общината, за да може всеки заинтересован да се запознае с него. Предвижда се настоящият доклад също да бъде публикуван на сайта на Общината.

Други методи за осигуряване на публичност по изпълнението на плана са публикации в медии (онлайн и традиционни) за развитието на проекти, заложи в ПИРО. Настоящият доклад се фокусира върху петата година от изпълнението на ПИРО, като се очаква мерките за публичност да продължат да се разгръщат в пълнота и през следващите години.

Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени

Съответствието на ПИРО Харманли със секторните планове и програми се постига чрез периодичен мониторинг на измененията или приемането на нови стратегически документи, отнасящи се до развитието на територията. За програмния период 2021-2027 г. ПИРО е един от първите документи, който задава рамка за разработване на по-детайлни секторни стратегии и програми. В този смисъл може да се заключи, че ПИРО е в пълен синхрон с останалите стратегически документи на местно ниво, включително тези, отнасящи се до климатичните изменения и мерките за борба с тях.

Допълнително, значителна част от средствата, предвидени за реализация на дейности и проекти в ПИРО, се очаква да бъдат привлечени от „европейските програми“. Последните се изготвят в пълен синхрон с националното законодателство и стратегическа рамка. Това гарантира съответствие на ПИРО с останалите стратегически документи на регионално и национално ниво.

Мерки за прилагане принципа на партньорство

Прилагането на принципа на партньорство е гарантиран от изготвената комуникационна стратегия, приложение към ПИРО Харманли. В нея са идентифицирани и систематизирани заинтересованите страни и са определени приложимите комуникационни дейности и канали за комуникиране на ПИРО Харманли.

Резултати от извършени оценки

Към момента на разработване на настоящия доклад има изготвени три годишни доклада за наблюдение на изпълнението на ПИРО Харманли – за 2022, 2023 и 2024 г., както и междинна оценка за наблюдение изпълнението на стратегическия документ за периода 2021-2023 г.

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ

В тази част на доклада е отчетено изпълнението на проектите, които допринасят за осъществяването на заложените цели и приоритети на плана. Те са систематизирани в табличен вид в **Приложение №1** към настоящия доклад, което включва:

- проекти и дейности, които са изцяло реализирани през 2025 г.;
- проекти и дейности, които са приключени през 2025 г.;
- проекти, които са в процес на изпълнение. Тук се включват проекти и дейности, които са започнати в предишни години или през 2025 г. и се очаква да продължат и през следващите години. При финансовото отчитане, там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума само за 2025 г.

Проектите с принос към ПИРО Харманли, изпълнени или в процес на изпълнение и оценка през 2025 г., са систематизирани по отделните приоритети и мерки.

Напредъкът в изпълнението на ПИРО през 2025 г. има количествено измерение от общо **221 проекта/дейности** на обща проектна стойност от **94 224 590,22 лв.** Реално привлечените средства (местните инвестиции и трансферите от републиканския бюджет и от програмите на ЕС, и други източници) са в размер на **27 662 689,80 лв.** Реално привлечените средства на един човек са **1 217,76 лв.**


В **Приложение №1** са представени всички проектни дейности, осъществени през 2025 г. В таблицата са включени следните елементи:

- приоритети и изпълнени/изпълняващи се проекти/дейности към тях;
- проектна стойност на проектите/дейностите и реално изплатени средства;
- източник на финансиране и разпределение на финансовите средства;
- период на изпълнение на проектите/дейностите.

Изпълнението на ПИРО може да се разглежда в 2 направления. Първото е стойността на сключените договори по проектите и дейности през 2025 г. Второто е реално изплатените средства по тези договори. Това уточнение е важно, защото в края на 2025 г. са сключени договори по отделни програми, но в същото време все още не е направено плащане по тях. Поради тази причина се отчита разминаване между реалното финансово изпълнение, което е в размер на 19,06% от заложеното в ПИРО, и проектното такова (на база само сключени договори, без плащания по тях), което достига 65%.

В плана най-висок индикативен бюджет е заложен по Приоритет 3, но през 2025 г. най-много средства са изплатени за реализацията на проекти и дейности, попадащи в обхвата на Приоритет 5. Във **фигура 2** са онагледени проектната стойност и реално изплатените средства по проектите/дейностите, които се изпълняват през отчетната 2025 г.

Фигура 2. Проектна стойност и реално изплатени средства по проекти и дейности, разпределени по приоритети за 2025 г.

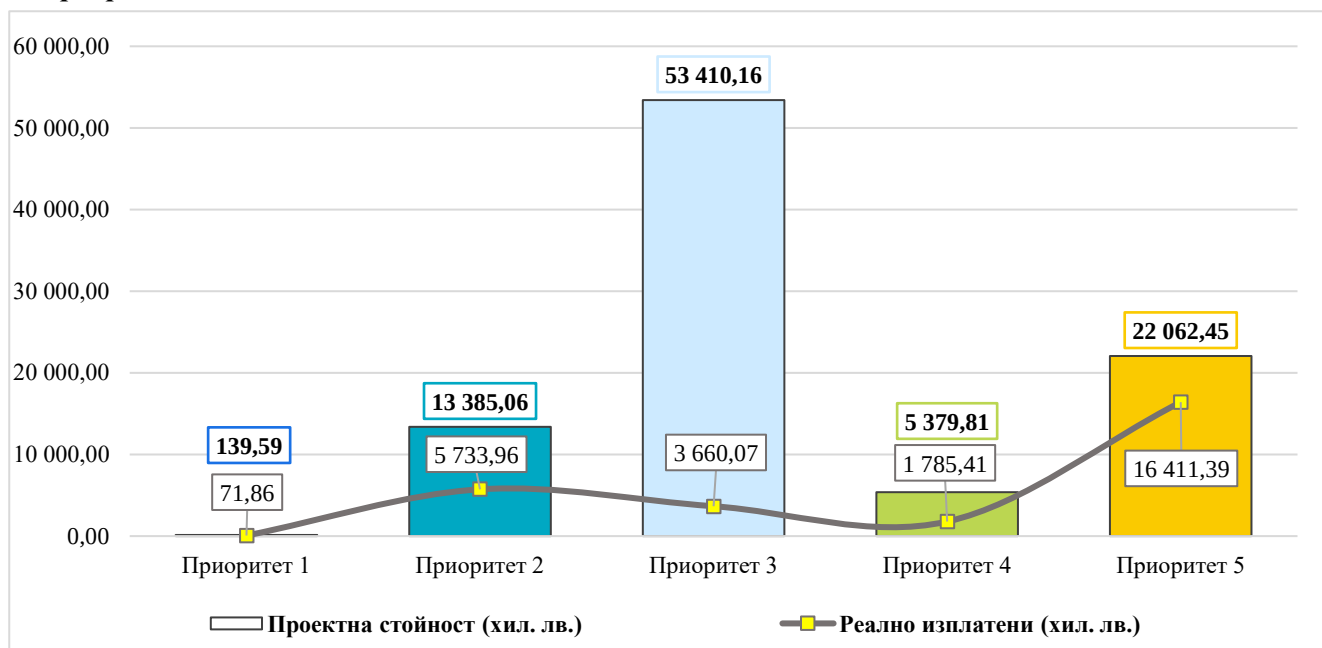

Източник: по данни на ПИРО Харманли 2021-2027 г., ИСУН, Община Харманли и собствени изчисления

За постигането на **Приоритет 1: Укрепване на административния капацитет, изпълнение на общински политики и сътрудничество** са изпълнени 6 проекта/дейности. Проектната им стойност е в размер на **139 588,61 лв.**, а са изплатени **51,5%** от тях. Закупени са технически устройства за общинската администрация. Предоставено е финансиране по проект „Осигуряване на техническа подкрепа за подготовката на концепция за интегрирани териториални инвестиции (втори прием) и проектни предложения за кандидатстване по Приоритет 2 на ППР 2021-2027 за нуждите на Община Харманли“, който има за цел да осигури техническа помощ за подготовка на КИТИ – II прием и проектни предложения за кандидатстване по Приоритет 2 на ППР 2021–2027. Общината изпълнява Концепция за интегрирани териториални инвестиции № BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“, като са сключени три административни договора. Дейности, които ще се изпълнят от Община Харманли, Сдружение „Лозаро-винари от Сакар“ - гр. Харманли и Исторически музей – Харманли са разпределени и отчетени като отделни интервенции, съобразно техния специфичен принос към съответните приоритети. Общинският бюджет има най-висок принос за реализацията на проектите/дейностите, попадащи в обхвата на приоритета през отчетната година.

Приоритет 2: Социално сближаване, укрепване и развитие на висококвалифициран човешки капитал се характеризира с 70 изпълнени и текущи проекти/дейности, като проектната им стойност е в размер на **13 385 056,44 лв.** Реално изплатени са **42,8%** от тази сума, като това се дължи на факта, че някои проекти са стартирали в предходни години и през 2025 г. е изплатена част от сумата за тяхната реализация, а други са започнали през 2025 г. и очакват финансиране в остатъка от програмния период. Реализират се проекти със социална насоченост като „Иновативни здравно-социални услуги в община Харманли“, „Грижа в дома в община Харманли“, „Укрепване на общинския капацитет в община Харманли“ и „Топъл обяд в община Харманли“. Извършени са ремонтни дейности в медицински и детски заведения, изпълнението на редица проекти, свързани с изграждането на училищна STEM среда и ВОКС, финансирани от НПВУ. Модернизира се материално-техническата база в учебните заведения. Изпълняват се и

проекти за приобщаващо образование, интеграция и десегрегация на училищата. Изплатени са средства и за реставрацията на два храма. Най-висок е дялът на финансиране от фондовете на ЕС.

През отчетната година изплатените средства за 71-те проекта/дейности, попадащи в обхвата на **Приоритет 3: Модернизиране на инфраструктурата** са в размер на **3 660 065,10 лв.** Проектната стойност възлиза на **53 410 159,99 лв.**, като реално изплатени са **6,9%** от тях. Финансирани са проекти за рехабилитация и реконструкция на съществуваща водопроводна и транспортна мрежа. Започнало е изпълнението на множество проекти за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, които се финансират по НПВУ. Продължава изпълнението на проект за енергийно обновяване на общинска сграда за административно обслужване. Изпълнени са дейности за повишаване на енергийната ефективност в различни общински и частни сгради. Най-много средства са усвоени по линия на централния бюджет.

Приоритет 4: Приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска, и опазване на околната среда има техническо изпълнение от 11 текущи или приключени проекта/инициативи, чиято проектна стойност възлиза на **5 379 807,86 лв.** Реално изплатени са **1 785 413,00 лв.** или **33,2%** от проектната стойност. През отчетната година продължава изпълнението на проект *„Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Свиленград“*, който е финансиран от ПОС. Започнала е реализацията на проект *„Надграждане на капацитета на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци за община Харманли“*. Изпълнени са проекти, свързани с подобряване на сметосъбирането в община Харманли и поддържането на чиста околна среда. По-голямата част от усвоените средствата са от европейските фондове.

Приоритет 5: Развитие на иновативна цифрова, кръгова и зелена икономика се характеризира с най-голям брой изпълнени/текущи проекти/дейности – 63. Проектната им стойност е в размер на **22 062 452,32 лв.**, като през 2025 г. са изплатени **74,4%** от тях, или **16 411 390,13 лв.** Усвоени са средства по редица проекти за подобряване на техническото оборудване на земеделски стопани, извършващи дейността си на територията на общината, както и множество проекти, насърчаващи внедряването на модерни практики и методи за производство. Изпълняват се проекти и дейности, свързани с подобряване на инфраструктурата за обслужване на отдиха и туризма. Започнало е изпълнението на два трансгранични проекта с Република Турция - *„Пътуване през времето по Марица“ („Maritsa Timeless Journey“)* и *„Въвеждане на нисковъглероден туризъм в трансграничен район на сътрудничество България и Турция“ („Low-carbon CBC“)*. Най-голям е финансовият принос на фондовете на ЕС. Значителен е и приносът на частните инвестиции, които подпомагат изпълнението на голяма част от проектите.


Общото изпълнение за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г. е **221 изпълнени и текущи проекта/дейности** със **средна стойност от 427,05 хил. лв.** на проектно предложение, които са разпределени по приоритетни направления, както следва:

- Приоритет 1 – **6 проекта/дейности** със средна стойност 23,26 хил. лв.;
- Приоритет 2 – **70 проекта/дейности** със средна стойност 191,22 хил. лв. (договорите за 3 проекта са сключени, но през 2025 г. няма изплатени средства);
- Приоритет 3 – **71 проекта/дейности** със средна стойност 752,26 хил. лв. (договорите за 39 проекта са сключени, но през 2025 г. няма изплатени средства);

- Приоритет 4 – **11 проекта/дейности** със средна стойност 489,07 хил. лв.;
- Приоритет 5 – **63 проекта/дейности** със средна стойност 350,20 хил. лв. (договорите за 13 проекта са сключени, но през 2025 г. няма изплатени средства);

Показателят „средна стойност“ следва да се интерпретира с оглед на съществуващите различия в размера на проектните средства по отделните проекти/дейности и техния брой в рамките на съответния приоритет.

Фигура 3. Средна стойност (дясна скала) и брой (лява скала) на текущите и изпълнени през 2025 г. проекти/дейности

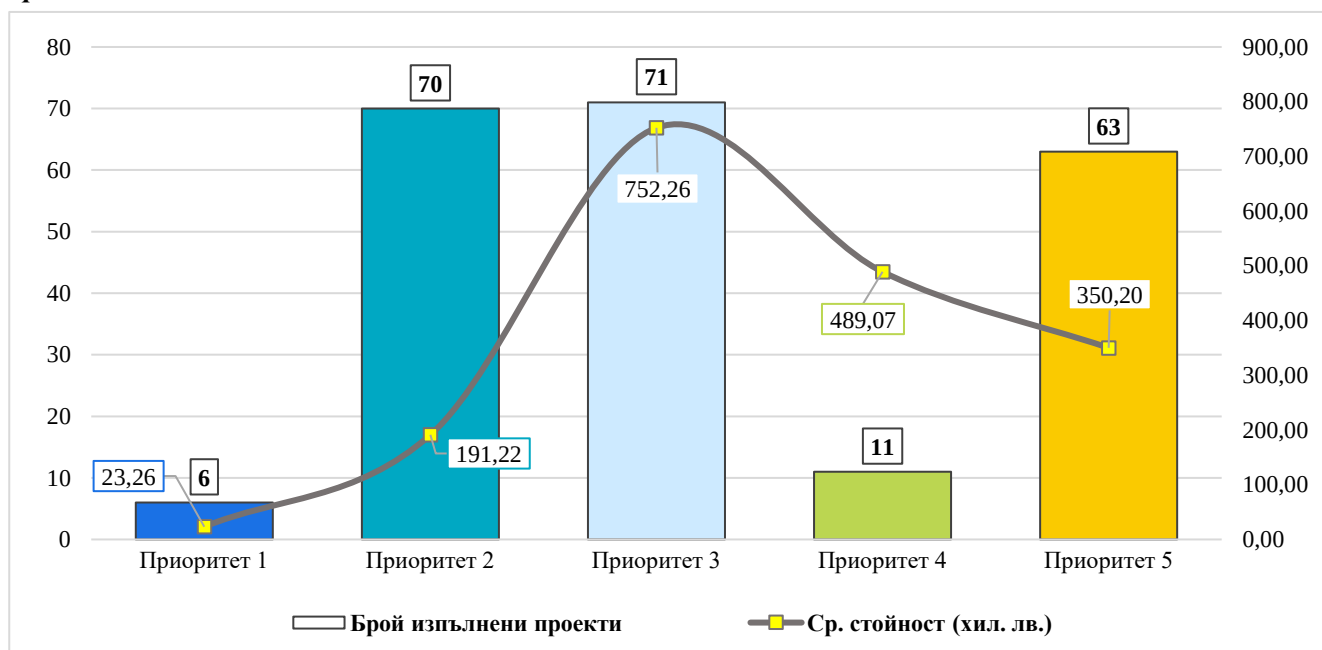


Източник: по данни на Община Харманли, ИСУН, собствени изчисления

При изготвянето на Плана за интегрирано развитие на община Харманли са определени основните компоненти на програмата за неговата реализация, сред които ключово място заема индикативната финансова таблица. Тя представя прогнозния финансов ресурс, необходим за изпълнението на предвидените проекти и дейности, съобразени с определените приоритети и цели на плана. Индикативната финансова таблица отразява разпределението на планираните средства както по приоритетни направления, така и по източници на финансиране, като осигурява цялостна рамка за финансовото обезпечаване и изпълнението на ПИРО. Общият индикативен финансов ресурс за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Харманли 2021-2027 г. е **145 170 000 лв.**


Според планираното в ПИРО за Приоритет 1 са предвидени средства в размер на **1 970 000 лв.**, а през 2025 г. изплатените суми представляват 3,7% от индикативните за приоритета в ПИРО. Бюджетът за изпълнение на Приоритет 2 е **20 220 000 лв.**, а през отчетната година са изплатени 28,4% от планираните за приоритета в ПИРО. Реалното финансово изпълнение на Приоритет 3 през 2025 г. е 4,6% от индикативния бюджет, който е в размер на **79 150 000 лв.** Приоритет 4 има предварително планиран бюджет в размер на **23 830 000 лв.**, като през 2025 г. изплатените средства са само 7,5% от индикативните в ПИРО. Приоритет 5 има индикативен бюджет в размер на **20 000 000 лв.**, а през отчетната година делът на реално изплатените средства спрямо предварително планираните е 82,1%.

Съотношението между реално изпълненото през 2025 г. и индикативното в стратегическия документ е **19,06%.**

Фигура 4. Индикативното финансово разпределение по приоритети в ПИРО Харманли 2021-2027 г. (в лева)

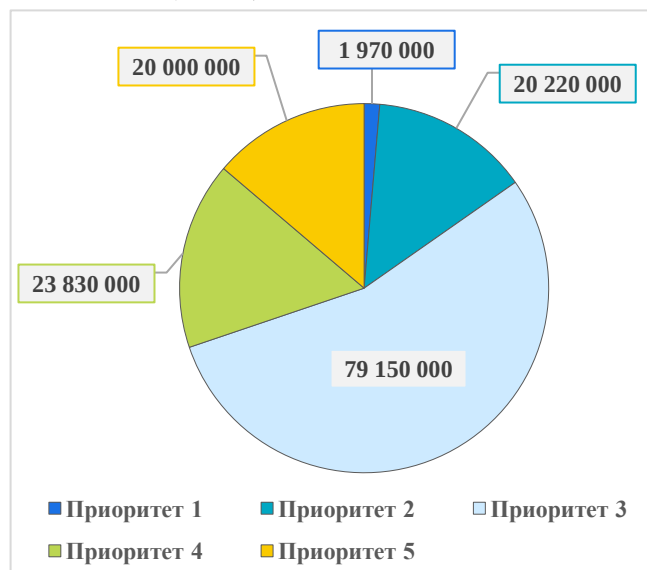

Фигура 5. Разпределение на реално изплатените средства по приоритети в ПИРО Харманли през 2025 г. (в лева)

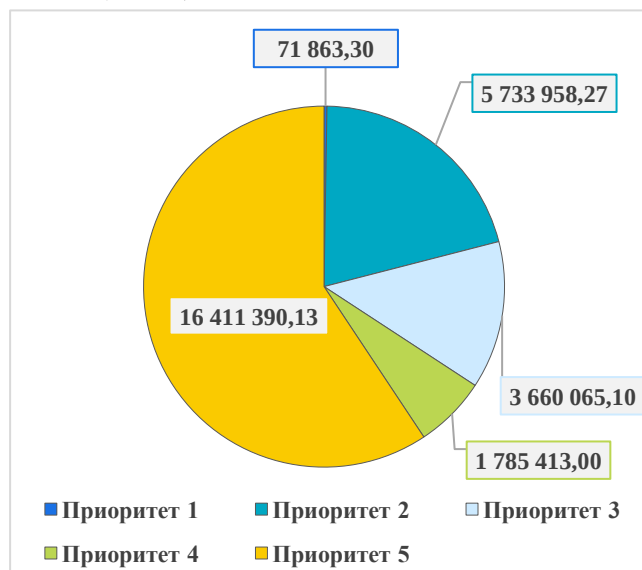

Източник: по данни на ПИРО Харманли 2021-2027 г., ИСУН, Община Харманли и собствени изчисления

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка и между планираните индикативни средства и реално изразходваните такива, според източника на финансиране. Така може да се направи преценка доколкото изпълнението на ПИРО се придържа към финансовите рамки, които са заложили в него и най-вече до каква степен те са били реалистични, за да може при необходимост да бъдат коригирани.


В ПИРО Харманли е предвидено финансирането на проектите/дейностите да бъде от пет различни източника. Най-много средства е предвидено да бъдат усвоени от европейските фондове - **105 769 200 лв.**, като през 2025 г. по тази линия са усвоени 15,4% от индикативните в плана. Планираните средства от републиканския бюджет са в размер на **14 844 600 лв.**, като през 2025 г. размерът на реално изплатените средства спрямо предвиденото в ПИРО е 20,5%. През отчетната година изплатените средства от общинския бюджет представляват 4,2% от предварително планираните от този източник, които са в размер на **22 533 800 лв.** Най-малко средства са предвидени да постъпят от други източници (частни и други инвестиции) – **2 022 400 лв.**, но през 2025 г. делът на усвоените средства спрямо планираните надвишава 365%.

Общото изпълнение за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г. е **221 изпълнени или текущи проекта и дейности**, които са финансирани от четири различни източника, разпределени, както следва:


- Общински бюджет – **54 проекта/дейности**, за които са изплатени **947 015,00 лв.** (за 13 проекта/дейности няма изплатени средства през отчетната година);
- Фондове на ЕС – **116 проекта/дейности**, за които са изплатени **16 282 666,09 лв.**, (за 39 проекта/дейности няма изплатени средства през отчетната година);
- Централен бюджет – **65 проекта/дейности**, за които са изплатени **3 040 894,00 лв.** (за 12 проекта/дейности няма изплатени средства през отчетната година);
- Други източници – **35 проекта/дейности**, за които са изплатени **7 392 114,71 лв.** за 12 проекта/дейности няма изплатени средства през отчетната година);

*Забележка: Броят проекти/дейности става по-голям от 221, тъй като част от проектите са финансирани от повече от един източник.

Фигура 6. Индикативно разпределение по източници на финансиране в ПИРО Харманли 2021-2027 г. (в лева)

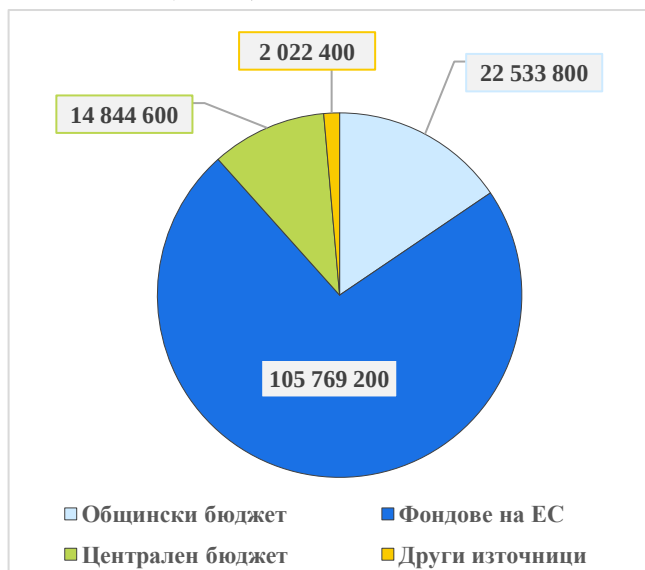

Фигура 7. Разпределение на реално изплатените средства по източници на финансиране в ПИРО Харманли през 2025 г. (в лева)

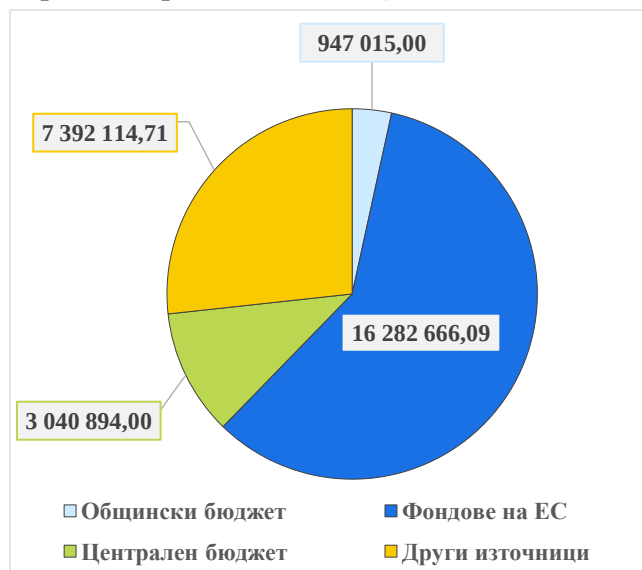

Източник: по данни на ПИРО Харманли 2021-2027 г., ИСУН, Община Харманли и собствени изчисления

Таблица 9. Обобщена финансова таблица по приоритети за 2025 г.

Приоритет	Проектна стойност (хил. лв.)	Проекти (бр.)	Средна стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (хил. лв.)	Индикативно в ПИРО (хил. лв.)	Изпълнение (%)
Приоритет 1: Укрепване на административния капацитет, изпълнение на общински политики и сътрудничество	139,59	6	23,26	71,86	1 970	3,65
Приоритет 2: Социално сближаване, укрепване и развитие на висококвалифициран човешки капитал	13 385,06	70	191,22	5 733,96	20 220	28,36
Приоритет 3: Модернизиране на инфраструктурата	53 410,16	71	752,26	3 660,07	79 150	4,62
Приоритет 4: Приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска, и опазване на околната среда	5 379,81	11	489,07	1 785,41	23 830	7,49
Приоритет 5: Развитие на иновативна цифрова, кръгова и зелена икономика	22 062,45	63	350,20	16 411,39	20 000	82,06
ОБЩО	94 377,07	221	427,05	27 662,69	145 170	19,06

Източник: по данни на Община Харманли, ИСУН, собствени изчисления

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

ПИРО Харманли 2021-2027 г. обвързва динамични елементи, които търпят изменение във времето и затова е важно осъществяването на периодични наблюдения, на базата на които да се направят заключения и да се дадат, при необходимост, предложения за подобряването и изпълнението му през остатъка от програмния период.

- По отношение на демографското развитие в община Харманли се отчита минимално изменение на населението, с повишаване на естествения и значително занижаване на механичния прираст. Наблюдава се спад в броя на населението във всички възрастови групи.
- Икономиката на община Харманли през 2024 г. (последните актуални данни) се характеризира с повишаване броя предприятия и запазена инвестиционна активност, което показва устойчивост на местния бизнес. В същото време се наблюдава спад при заетостта, произведената продукция и нетните приходи от продажби.
- През 2025 г. пазарът на труда в общината остава стабилен, като се запазва нивото на регистрираната безработица и продължава активното прилагане на мерки и програми за насърчаване на заетостта, обучението и професионалната квалификация. Наблюдава се успешна интеграция на младежи и уязвими групи на пазара на труда, съпроводена с осезаемо нарастване на средната работна заплата.
- През разглеждания период община Харманли запазва стабилност в развитието на образователната и здравната инфраструктура, като продължава да осигурява достъп до качествени услуги за населението. Наред с това се наблюдават положителни тенденции в обхвата на децата и учениците и в предоставянето на социално значими услуги, въпреки предизвикателствата, свързани с демографските процеси.
- През отчетната 2025 г. 83,2% (129 индикатора) от индикаторите за резултат и продукт отчитат положително изпълнение, докато при 14,8% (23 индикатора) от тях не се наблюдава напредък. Делът на индикаторите (3 индикатора), за които не могат да бъдат оценени към настоящия момент, е 1,9%. Препоръчва се актуализация както на индикаторите за резултат, така и на тези за продукт. Възможно е да бъде предприет друг подход, при който броят на индикаторите е намален и те не са съотнесени към определени дейности.
- Финансовата реализация на ПИРО през 2025 г. е в размер на **19,06%**.
- През разглеждания период са осъществени **221 проекта/дейности**, които допринасят за изпълнението на заложените приоритети и мерки в ПИРО.
- Анализът показва наличие на дисбаланс както в броя на проектите, допринасящи за изпълнението на отделните приоритети, така и по отношение на реално изплатените средства в рамките на всеки приоритет.
- Препоръчва се при евентуална бъдеща актуализация на ПИРО, да се актуализира индикативния бюджет по източници, тъй като през отчетната година планираният бюджет от други източници е преизпълнен.
- Най-голям принос по отношение на реализацията на проектите имат средствата от фондовете на ЕС, а най-малък – средствата от общинския бюджет.

- Община Харманли привлича значителен финансов ресурс от външни източници. През 2025 г. на всеки лев от общинския бюджет общината е успяла да привлече **28,21 лв.** от други, различни от общинския, източници.
- Обобщено, изпълнението на ПИРО през 2025 г. поддържа и дори ускорява темпото на изпълнение от предходната 2024 г. С оглед на започналите нови проекти в общината се очаква следващият годишен доклад също да отчете напредък и добро изпълнение.
- Препоръчва се продължаване на добрата практика за изготвяне на годишни доклади с цел постигане на по-голяма прозрачност в управлението. Периодичното проследяване на напредъка създава необходимата основа за извършването на последваща оценка на изпълнението на ПИРО след края на програмния период.
- В следващите години от изпълнението на плана Община Харманли следва да продължи активно да разработва и подава проектни предложения, насочени към постигане на заложените в ПИРО приоритети и цели.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
Приоритет 1: Укрепване на административния капацитет, изпълнение на общински политики и сътрудничество		139 588,61	71 863,30		47 709,00	21 863,30	2 291,00	0,00	0,00						
1	Закупуване на 15 бр. компютърни конфигурации, Сграда на Общинска администрация	30 600,00	30 600,00	ОБ	30 600,00										
2	Закупуване на 10 бр. мултифункционални устройства, Сграда на Общинска администрация	14 400,00	10 530,00	ОБ	10 530,00										
3	Придобиване на 2 бр. компютърни конфигурации, Дирекция МДТ	6 000,00	4 080,00	ОБ	4 080,00										
4	Закупуване на фотоапарат, Общинска администрация	5 000,00	2 499,00	ОБ	2 499,00										
5	Закупуване на специализиран софтуер за нуждите на Общинска администрация, Административната сграда на Общинска администрация	21 122,00	2 291,00	ЦБ			2 291,00								
6	Осигуряване на техническа подкрепа за подготовката на концепция за интегрирани териториални инвестиции (втори прием) и проектни предложения за кандидатстване по Приоритет 2 на ПРР 2021-2027 за нуждите на Община Харманли	62 466,61	21 863,30	ПРР		21 863,30									
Приоритет 2: Социално сближаване, укрепване и развитие на висококвалифициран човешки капитал		13 385 056,44	5 733 958,27		349 768,00	4 208 939,02	1 137 429,00	30 322,25	7 500,00						
1	Устойчиви работни места за хора в неравностойно положение в ЕТ „Дега - Добри Иванов“, гр. Харманли	171 481,21	0,00	ПРЧР		0,00									
2	Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в „Общностен център за ранно детско развитие“ в кв. Дружба, УПИ II, кв. 619, по ПУП-ПРЗ, ПИ 77181.6.127.2 по КК на гр. Харманли	37 519,00	34 800,00	ОБ	34 800,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
3	Придобиване на лек автомобил за нуждите на Асистентска подкрепа	60 000,00	59 988,00	ЦБ			59 988,00								
4	Придобиване на употребяван лек автомобил за нуждите на Дом за стари хора, Харманли	30 000,00	29 900,00	ЦБ			29 900,00								
5	Придобиване на 2 бр. платформен подежник, Временна сграда за Дом за стари хора, Харманли	80 500,00	59 976,00	ОБ	59 976,00										
6	Закупуване на лаптоп за Дом за стари хора, Харманли	3 000,00	3 000,00	ЦБ			3 000,00								
7	Програмен продукт „Социални услуги“ за Дом за стари хора, Харманли	3 000,00	2 628,00	ЦБ			2 628,00								
8	Проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Харманли“	547 970,66	236 504,00	ПРЧР		236 504,00									
9	Проект „Грижа в дома в община Харманли“	1 254 990,65	135 288,89	ПРЧР		135 288,89									
10	Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Харманли“	86 013,67	9 998,00	ПРЧР		9 998,00									
11	Проект „Топъл обяд в община Харманли“	781 310,67	202 664,00	ПХОМП		202 664,00									
12	Образование без изключение	21 320,00	1 407,00	ПО		1 407,00									
13	Младежка загост +	131 155,00	131 155,00	ПРЧР		131 155,00									
14	Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска ясла „Ален мак“, гр. Харманли	465 747,61	196 795,00	ПРСР		196 795,00									
15	Ремонт, реконструкция и пристройка на съществуващ Дом за стари хора и прилагане на мерки за енергийна ефективност, гр. Харманли	3 629 664,00	787 668,00	НПВУ		787 668,00									
16	Енергийно обновяване и основен ремонт на сгради на „МБАЛ- Харманли“ ЕООД и „Медицински център 1-Харманли“ ЕООД, УПИ I, II и III в квартал № 99а, по ПУП-ПРЗ, ПИ с идентификатор № 77181.20.4 по КК на гр. Харманли, Сгради на МБАЛ Харманли и МЦ1 Харманли - ППР	166 573,00	156 000,00	ОБ	156 000,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
17	Оборудване на амбулатория за дентална медицинска помощ в гр. Харманли	121 289,02	121 289,02	ПРСР и ЧИ		90 966,77		30 322,25							
18	Развитие на потенциала за устойчивост и растеж на „ПАНАЦЕЯ МЦ“ ООД	85 366,62	0,00	ПКИП и ЧИ		0,00		0,00							
19	Конструктивно укрепване на сградата на ДГ „Ален Мак“, гр. Харманли - инженеринг	358 458,00	2 988,00	ЦБ			2 988,00								
20	Придобиване на беседка за ДГ „Ален мак“, гр. Харманли	6 480,00	6 480,00	ЦБ			6 480,00								
21	Закупуване на секционен шкаф „Гора“ за ДГ „Пролет“, гр. Харманли	954,00	954,00	ЦБ			954,00								
22	Закупуване на 11 бр. компютърна система в Здравни кабинети в детски градини и училища	22 440,00	22 440,00	ЦБ			22 440,00								
23	Придобиване на ПП „Ажур“ за ДГ „Пролет“, гр. Харманли	1 570,00	1 570,00	ЦБ			1 570,00								
24	База към ПП „Ажур“ за ДГ „Ален мак“, гр. Харманли	96,00	96,00	ЦБ			96,00								
25	Допълнителни бази към ПП „Ажур“ за ДГ „Детски свят“, гр. Харманли	282,00	282,00	ЦБ			282,00								
26	Придобиване на модул изпращане на електронни документи за ДГ „Пролет“, гр. Харманли	552,00	552,00	ЦБ			552,00								
27	Зелена идея в ДГ „Ален мак“, гр. Харманли	7 500,00	7 500,00	ПУДООС					7 500,00						
28	Придобиване на интерактивен дисплей за СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли	4 300,00	4 300,00	ЦБ			4 300,00								
29	Придобиване на интерактивен дисплей, OPS компютър и мобилна стойка за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	5 904,00	5 904,00	ЦБ			5 904,00								
30	Придобиване на интерактивен под с FlySky92 с игри подвижен за НУ „Отец Паисий“, гр. Харманли	9 890,00	9 890,00	ЦБ			9 890,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
31	Придобиване на интерактивна дъска за НУ „Отец Паисий“, гр. Харманли	1 130,00	1 130,00	ЦБ			1 130,00								
32	Закупуване на 3 бр. мултимедийни проектори, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Иваново	3 682,00	3 682,00	ЦБ			3 682,00								
33	Изграждане на физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“ с. Славяново	447 648,00	447 648,00	ЦБ			447 648,00								
34	Изграждане на физкултурен салон в НУ „Отец Паисий“, гр. Харманли	447 648,00	447 648,00	ЦБ			447 648,00								
35	Изграждане на пристройка „Склад“ за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Иваново	16 625,00	16 625,00	ЦБ			16 625,00								
36	Изграждане на зала за спортни дейности в двора на НУ „Алеко Константинов“, гр. Харманли - ППР	23 000,00	20 400,00	ОБ	20 400,00										
37	Закупуване на инверторен климатик за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	1 250,00	1 250,00	ЦБ			1 250,00								
38	Закупуване на инверторен климатик за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	1 250,00	1 250,00	ЦБ			1 250,00								
39	Изграждане на спортни площадки в двора на НУ „Алеко Константинов“, гр. Харманли	7 120,00	5 520,00	ОБ	5 520,00										
40	Придобиване на разширителен съд за котел за НУ „Отец Паисий“, гр. Харманли	1 560,00	1 560,00	ЦБ			1 560,00								
41	Придобиване на 4 бр. климатични системи за НУ „Отец Паисий“ гр. Харманли	6 360,00	6 360,00	ЦБ			6 360,00								
42	Изграждане на 2 спортни площадки със зона за малки деца и зона за пораснали деца в двора на ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	43 548,00	43 548,00	ЦБ			43 548,00								
43	Придобиване на декори за сцена СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли	2 400,00	2 400,00	ЦБ			2 400,00								
44	Закупуване на фитнес уреди (степпер и туистър) за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	990,00	990,00	ЦБ			990,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
45	Закупуване на 2 бр. музикални колони ART 712-A MK5 Digital за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	2 160,00	2 160,00	ЦБ			2 160,00								
46	Закупуване на хресторез за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	1 100,00	1 100,00	ЦБ			1 100,00								
47	Закупуване на Во Во безжична биофийдбек система за тренировка на фината моторика за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	996,00	996,00	ЦБ			996,00								
48	Закупуване на фотоапарат със статив за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	1 770,00	1 770,00	ЦБ			1 770,00								
49	Закупуване на Шкаф LABO с мивка и батерия за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	1 392,00	1 392,00	ЦБ			1 392,00								
50	Закупуване на шкаф къща за ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	1 380,00	1 380,00	ЦБ			1 380,00								
51	Закупуване на шкаф със заключване ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли	1 120,00	1 120,00	ЦБ			1 120,00								
52	Придобиване на ПП Защитна стена за СУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли	2 448,00	2 448,00	ЦБ			2 448,00								
53	Изграждане на училищна STEM среда в Начално училище „Алеко Константинов“, Харманли - Aleko Space STEM център	263 908,00	142 988,00	НПВУ		142 988,00									
54	Проект „Млад изследовател“ в НУ „Отец Паисий“, гр. Харманли	181 162,68	91 028,00	НПВУ		91 028,00									
55	Проект „Приобщаващо образование и образователна интеграция за десегрегация на училищата на територията на община Харманли, вкл. превенция на вторична сегрегация и против дискриминацията“	397 919,27	50 813,00	ПО		50 813,00									
56	Проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Иван Вазов“, гр. Харманли“	363 600,00	228 113,00	НПВУ		228 113,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
57	Проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Иван Вазов“, с. Славяново“	181 454,20	0,00	НПВУ		0,00									
58	Проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Иваново“	180 158,72	55 593,00	НПВУ		55 593,00									
59	Проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Христо Ботев“, с. Българин“	181 436,27	75 862,00	НПВУ		75 862,00									
60	Проект „Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Христо Ботев“, с. Бисер“	181 334,19	112 819,00	НПВУ		112 819,00									
61	Проект „Изграждане на училищна STEM среда в ПГЕТ „Захари Стоянов“, гр. Харманли“	252 499,78	74 981,33	НПВУ		74 981,33									
62	Проект „Изграждане на училищна STEM среда в Средно училище „Неофит Рилски“, гр. Харманли“	272 699,97	173 655,00	НПВУ		173 655,00									
63	Проект „Концепция за изграждане на училищна STEM среда в Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачов Славейков“, гр. Харманли	181 083,38	165 978,56	НПВУ		165 978,56									
64	BG05SFPR001-1.005-0005 „Приобщаващо образование и образователна интеграция за ограмотяване на възрастните в община Харманли“	392 330,40	83 696,00	ПО		83 696,00									
65	Закупуване на 3 бр. ъглови разтегателни дивани за апартаменти в Детски лагер, гр. Добринище	6 000,00	2 238,00	ОБ	2 238,00										
66	Закупуване на 2 бр. бойлери (500 л.) за Детски лагер, гр. Добринище	12 000,00	12 000,00	ОБ	12 000,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
67	Изработване на 3 бр. скулптурни композиции „Изворът на Белоногата“ от бронз и гранит с фигурата на Гергана и указателни табели, гр. Харманли	35 000,00	29 234,00	ОБ	29 234,00										
68	Изработка и поставяне на постамент с бюста на Генчо Стоев по повод 100 години от рождението на писателя, гр. Харманли	29 600,00	29 600,00	ОБ	29 600,00										
69	Възстановяване и ремонт на храм „Свети Архангел Михаил“ и действия по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, УПИ I-124, кв. 356 по плана на с. Славяново, общ. Харманли, обл. Хасково	584 187,72	584 187,72	ПРСР		584 187,72									
70	Възстановяване и ремонт на храм „Свети Атанасий“ и действия по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства, УПИ XIX, кв. 156 по ПРЗ, ПИ с ид. по 77181.10.477 по КК на гр. Харманли, община Харманли	576 777,75	576 777,75	ПРСР		576 777,75									
Приоритет 3: Модернизиране на инфраструктурата		53 410 159,99	3 660 065,10		439 940,00	1 270 055,25	1 529 336,00	363 763,85	56 970,00						
1	Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците - ул. „Св. Св Кирил и Методий“, ул. „Климент Охридски“, бул. „Освободител“, ул. „Г. Жечев“, гр. Харманли	365 440,00	0,00	ЦБ			0,00								
2	Реконструкция на тротоари и изграждане на зелена инфраструктура в кв. Дружба, гр. Харманли - ППР	6 960,00	6 720,00	ОБ	6 720,00										
3	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Майор Чулков“ в участъка от о.т. 121 до о.т. 792 в гр. Харманли - инженеринг	88 071,00	80 893,00	ОБ и ЦБ	622,00		80 271,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
4	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения на ул. „Бельо Бакалов“, ул. „Константин Величков“ и ул. „Раковска“ в гр. Харманли - инженеринг	466 138,00	464 417,00	ОБ и ЦБ	17 159,00		447 258,00								
5	Рехабилитация и реконструкция на източно платно на бул. „Освободител“ в участъка от бул. „България“ до ул. „Преслав“ в гр. Харманли - инженеринг	365 743,00	363 583,00	ЦБ	0,00		363 583,00								
6	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Малина“ в участъка от о.т. 829 до о.т. 827 в гр. Харманли - инженеринг	69 119,00	68 039,00	ОБ и ЦБ	3 400,00		64 639,00								
7	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Чайка“ в участъка от о.т. 827 до о.т. 834 в гр. Харманли - инженеринг	87 360,00	86 040,00	ОБ и ЦБ	4 960,00		81 080,00								
8	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения на улица между о.т. 70А и о.т. 70Г в гр. Харманли, гр. Харманли - инженеринг	135 000,00	0,00	ОБ	0,00										
9	Основен ремонт на източен тротоар по бул. „България“ с обособяване на парко места между о.т. 670-671-672-673а гр. Харманли - инженеринг	100 000,00	0,00	ЦБ			0,00								
10	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „П. П. Славейков“ в участъка от бул. „България“ до ул. „Васил Левски“, гр. Харманли - инженеринг	767 000,00	0,00	ОБ и ЦБ	0,00		0,00								
11	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Искър“ в участъка от ул. „Г. М. Димитров“ до ул. „Капитан Петко войвода“, гр. Харманли, гр. Харманли - инженеринг	364 700,00	0,00	ОБ и ЦБ	0,00		0,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
12	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Петко Каравелов“ в участъка от ул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Васил Левски“, гр. Харманли - инженеринг	757 000,00	0,00	ОБ и ЦБ	0,00		0,00								
13	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод по ул. „Св. Климент Охридски“ в участъка от о.т. 70 до о.т. 86 /от ул. „Братя Миладинови“ до ул. „Иван Вазов“/ в гр. Харманли - инженеринг	85 000,00	1 560,00	ЦБ			1 560,00								
14	Ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, сградни отклонения и рехабилитация на улична мрежа в малките населени места на община Харманли, село Шишманово и село Славяново, общ. Харманли - инженеринг	3 025 000,00	0,00	ОБ	0,00										
15	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Христо Смирненски“ в участъка от ул. „Балкан“ до ул. „Люле Бургас“, гр. Харманли - инженеринг	1 145 800,00	0,00	ОБ и ЦБ	0,00		0,00								
16	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Майор Чулков“ в участъка от о.т. 792 до о.т. 792А в гр. Харманли - инженеринг	200 000,00	0,00	ОБ	0,00										
17	Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения по улица „Иван Гебешев“ в участъка между бул. „България“ и ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Харманли, гр. Харманли - инженеринг	80 000,00	0,00	ОБ	0,00										
18	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения на ул. „Спартак“ в с. Бисер, община Харманли - инженеринг	390 000,00	0,00	ОБ	0,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
19	Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения по ул. „Балкан“ от о.т. 494 до о.т.708 и ул. „Братя Миладинови“ от о.т. 623 до о.т. 790 по ПУП на гр. Харманли - инженеринг	270 388,00	0,00	ОБ и ЦБ	0,00		0,00								
20	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Д-р А. Чочков“ до бул. „Цар Освободител“ в гр. Харманли, гр. Харманли- инженеринг	246 000,00	0,00	ЦБ			0,00								
21	Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Христо Смирненски“ в участъка от ул. „Н. Петков“ до ул. „Я. Сакъзов“ в гр. Харманли, гр. Харманли- инженеринг	130 000,00	0,00	ЦБ			0,00								
22	Инвестиции във ВиК мрежата	56 970,00	56 970,00	ВиК					56 970,00						
23	Рехабилитация и реконструкция на ул. „Сакар планина“ на територията на гр. Харманли - инженеринг	834 711,00	0,00	ЦБ			0,00								
24	Основен ремонт на улица в участъка от о.т. 126 до о.т. 45, с. Поляново, общ. Харманли, село Поляново, община Харманли - инженеринг	246 000,00	235 254,00	ОБ	235 254,00										
25	Реконструкция на източен тротоар с обособяване на паркинг по ул. „Сакар планина“ в участъка между бул. „България“ и ул. „Бенковска“ /пред жилищен блок с идентификатор 77181.18.14/ на гр. Харманли, гр. Харманли - инженеринг	80 000,00	0,00	ЦБ			0,00								
26	Изграждане на велоалея от „Градска градина“ до парк в кв.44 по ПУП на гр. Харманли	13 200,00	13 200,00	ОБ	13 200,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
27	Изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на Хасково, Свиленград и Харманли	409 169,74	0,00	ОБ и НПВУ	0,00	0,00									
28	Енергийно обновяване на общинска сграда за административно обслужване с идентификатор 77181.11.120.2 по плана на гр. Харманли, Сградата на Общинска администрация Харманли	730 990,50	27 251,00	НПВУ		27 251,00									
29	Енергийно обновяване и основен ремонт на многофамилна жилищна сграда - Блок №8, ж.к. Дружба, гр. Харманли, област Хасково	67 200,00	61 200,00	ОБ	61 200,00										
30	Закупуване на климатични системи, Сгради на Общинска администрация Харманли	17 336,00	17 335,00	ОБ	17 335,00										
31	Закупуване на климатични системи, Приемни кабинети на районни полицейски инспектори	2 799,00	2 799,00	ЦБ			2 799,00								
32	Закупуване на климатична система, Помещение на МКБППМН	1 399,00	1 399,00	ЦБ			1 399,00								
33	Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди на ДЯ „Ален мак“, УПИ III, кв.60 по плана на гр. Харманли	10 200,00	9 000,00	ОБ	9 000,00										
34	Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди на ДГ „Ален мак“, УПИ III, кв.60 по плана на гр. Харманли	10 200,00	9 000,00	ОБ	9 000,00										
35	Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди на ДГ „Детски свят“, УПИ X, кв.146 по плана на гр. Харманли	10 200,00	9 000,00	ОБ	9 000,00										
36	Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди на ДГ „Пролет“, УПИ II, кв.2 по плана на гр. Харманли	11 400,00	10 200,00	ОБ	10 200,00										
37	Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди на ОУ „Иван Вазов“, УПИ IX, кв.159а по плана на гр. Харманли	10 200,00	9 000,00	ОБ	9 000,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
38	Закупуване на климатични системи, Детски лагер, гр. Добринище	6 660,00	6 660,00	ОБ	6 660,00										
39	Закупуване на климатик, Общинска администрация Харманли	2 678,00	2 678,00	ЦБ			2 678,00								
40	Закупуване на климатици, Сградата на Исторически музей Харманли	4 440,00	4 440,00	ЦБ			4 440,00								
41	Закупуване на климатична система, Ритуална зала Гробищен парк	5 299,00	5 299,00	ОБ	5 299,00										
42	Закупуване на климатик за банкетна зала на хижа „Синия връх“, община Харманли	3 300,00	3 300,00	ОБ	3 300,00										
43	Закупуване на климатични системи, Сграда на Културен център, гр. Харманли	16 939,00	16 939,00	ОБ	16 939,00										
44	Закупуване на климатик, ОП „Горска компания“, Харманли	1 404,00	1 404,00	ОБ	1 404,00										
45	Инвестиции, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ в Аркус 99 ООД	717 724,87	717 724,87	ПРСР и ЧИ		358 862,43		358 862,44							
46	Закупуване на фотоволтаична система с интегрирана мощност от 5.5 kWp за нуждите на еднофамилно жилище в село Върбово, община Харманли	16 338,01	16 338,01	НПВУ и ЧИ		11 436,60		4 901,41							
47	Изграждане на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници с АС мощност 5MW и ЛСС за съхранение на електроенергия с мощност 2 MW и капацитет 6 MWh	2 760 000,02	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
48	Монтаж на ФВЕЦ за собствено потребление с мощност до 10 квп на съществуващ покрив на сграда в УПИ V - 138 кв. 27 на с. Иваново, общ. Харманли, обл. Хасково	9 304,82	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
49	Инсталиране на фотоволтаична система в Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждане „Надежда“ и закупуване на електрическо превозно средство и свързана зарядна станция	103 155,01	0,00	НПВУ		0,00									
50	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“ № 66-74, бл.3, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г и вх. Д, гр. Харманли	3 670 378,19	0,00	ПРР		0,00									
51	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ж.к. „Дружба“, бл. 5, вх. А и вх. Б – Веселие, гр. Харманли	1 641 959,97	0,00	ПРР		0,00									
52	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, кв. „Тракия“ бл. 16, вх. А и Б, гр. Харманли	1 600 015,94	0,00	ПРР		0,00									
53	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“, № 49, бл. 9-2а, вх. А и вх. Б, гр. Харманли	1 259 189,91	0,00	ПРР		0,00									
54	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“ № 78-Щаба, гр. Харманли	849 907,41	0,00	ПРР		0,00									
55	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 15, гр. Харманли	1 215 469,70	0,00	ПРР		0,00									
56	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“ № 69, вх. А и Б, гр. Харманли	1 787 097,65	0,00	ПРР		0,00									
57	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда бул. „България“, № 45, бл. 9-1, вх. А и вх. Б, гр. Харманли	1 521 285,88	0,00	ПРР		0,00									
58	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“ № 22, блок 116, гр. Харманли	1 620 404,74	0,00	ПРР		0,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
59	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ул. „Александър Стамболийски“ № 97, вх. А и вх. Б, гр. Харманли	204 398,77	0,00	ОБ и ПРР	0,00	0,00									
60	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“, бл. № 31, вх. А и вх. Б, гр. Харманли	1 863 260,76	0,00	ПРР		0,00									
61	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“ № 24, гр. Харманли	1 506 746,18	0,00	ПРР		0,00									
62	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ж.к. „Тракия“, бл. 5А, вх. А и вх. Б, гр. Харманли	1 382 650,78	0,00	ПРР		0,00									
63	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ул. „Бенковска“ № 16, гр. Харманли	1 363 560,92	0,00	ПРР		0,00									
64	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, кв. „Изгрев“, бл. 304, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, гр. Харманли	5 679 679,51	0,00	ПРР		0,00									
65	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ж.к. „Тракия“, бл. 14, вх. А, Б, В, гр. Харманли	1 800 866,34	630 303,22	ПРР		630 303,22									
66	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“, бл. № 27, вх. А и вх. Б, гр. Харманли	1 903 456,80	0,00	ПРР		0,00									
67	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ж.к. „Тракия“, бл. 15, вх. А, Б, гр. Харманли	1 684 855,17	0,00	ПРР		0,00									
68	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, бул. „България“, бл. № 29, вх. А и вх. Б, гр. Харманли	1 566 831,39	0,00	ПРР		0,00									
69	Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ДГ „Детски свят“ в УПИ Х, кв. 146 по ПУП на гр. Харманли	456 353,00	242 202,00	ПРСР		242 202,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
70	Монтаж на ФВЕЦ за собствено потребление с мощност до 10 квп и съоръжение за съхранение на електрическа енергия на същ. покрив на сграда с ид. 77181.10.250.3 в Поземлен имот 77181.10.250, област Хасково, община Харманли, гр. Харманли, п.к. 6450, ул. „Братя Миладинови“ № 34	21 454,01	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
71	Основен ремонт на централен площад и прилежащи пространства, гр. Харманли - инженеринг	3 506 400,00	479 917,00	ОБ и ЦБ	288,00		479 629,00								
Приоритет 4: Приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска, и опазване на околната среда		5 379 807,86	1 785 413,00		59 504,00	1 354 071,00	371 838,00	0,00	0,00						
1	Закупуване на трактор, ОП „Превенция, БС“, Харманли	58 800,00	58 800,00	ЦБ			58 800,00								
2	Закупуване на бензинов къртач, ОП „Превенция, БС“, Харманли	7 998,00	7 998,00	ЦБ			7 998,00								
3	Закупуване на прикачен челен товарач, ОП „Превенция, БС“, Харманли	21 360,00	21 360,00	ЦБ			21 360,00								
4	Закупуване на климатична система, офис на ОП „Чистота“, Харманли	1 404,00	1 404,00	ОБ	1 404,00										
5	Придобиване на специализиран автомобил водоноска (8 т.), със система за пръскане и миене, ОП „Чистота“, Харманли	226 800,00	226 800,00	ЦБ			226 800,00								
6	Придобиване на употребяван товарен автомобил до 3.5 т., за нуждите на ОП „Превенция, благоустройство и строителство“	44 880,00	44 880,00	ЦБ			44 880,00								
7	Придобиване на професионално обзавеждане и оборудване в летен ресторант Градска градина гр. Харманли	57 600,00	27 500,00	ОБ	27 500,00										
8	Закупуване на 2 бр. тракторни косачка, ОП „Чистота“, Харманли	16 800,00	16 800,00	ОБ и ЦБ	4 800,00		12 000,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
9	Рекултивация на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Симеоновград, Тополовград, Свиленград, Любимец, Маджарово и Стамболово, Регионално депо за ТБО в гр. Харманли - инженеринг	3 721 232,30	1 173 639,00	ОБ и ПОС	0,00	1 173 639,00									
10	Придобиване на 2 бр. многофункционални контейнери, Община Харманли	30 000,00	25 800,00	ОБ	25 800,00										
11	Проект „Надграждане на капацитета на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими битови отпадъци за община Харманли“	1 192 933,56	180 432,00	ОБ и ПОС	0,00	180 432,00									
Приоритет 5: Развитие на иновативна цифрова, кръгова и зелена икономика		22 062 452,32	16 411 390,13		50 094,00	9 427 737,52	0,00	6 933 558,61	0,00						
1	Поземлен имот с проектен идентификатор 77181.13.275 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно, точка тринадесет, точка двеста седемдесет и пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково/площ 345 кв.м./, гр. Харманли	12 094,00	12 094,00	ОБ	12 094,00										
2	Инвестиция в бъдещето	27 316,67	19 952,50	ПРСР и ЧИ		14 964,37		4 988,13							
3	Изграждане на ремонтна работилница за строителна техника	374 344,28	373 671,49	ПРСР и ЧИ		280 253,62		93 417,87							
4	Дигитализация на предприятията	28 398,01	0,00	ПКИП и ЧИ		0,00		0,00							
5	Адаптирана работна среда в ДАНИЕЛ ФЕШЪН ООД	114 988,39	0,00	ПРЧР		0,00									
6	Закупуване на оборудване за нуждите на автомивка на самообслужване в гр. Харманли	47 775,04	47 775,04	ПРСР и ЧИ		35 831,25		11 943,79							
7	Инвестиция в специализирани машини за нуждите на автомивка на самообслужване и пералня за килими на територията на община Харманли	43 200,00	43 200,00	ПРСР и ЧИ		32 400,00		10 800,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
8	Разширяване на дейността на „Камелия“ ЕООД чрез изграждане на автомивка и довършителни дейности в автосервиз	327 289,16	321 500,14	ПРСР и ЧИ		241 125,11		80 375,03							
9	Развитие на потенциала за устойчивост и растеж на „КОВЕГ“ ООД	167 920,05	167 920,05	ПКИП и ЧИ		125 940,02		41 980,03							
10	Инвестиции в технологична и екологична модернизация в „Лейди Груп“ ЕООД	82 499,69	82 499,69	НПВУ и ЧИ		41 249,83		41 249,86							
11	Модернизиране на търговски обект за продажба на горива	206 310,03	206 310,03	ПРСР и ЧИ		154 732,52		51 577,51							
12	Разширение и модернизация на предприятие за месодобив и месопреработка в гр. Харманли	3 768 207,05	3 768 207,05	ПРСР и ЧИ		2 761 309,03		1 006 898,02							
13	Инвестиции в технологична и екологична модернизация за подобряване на цялостната дейност в земеделското стопанство Петранка	332 491,10	332 491,10	ПРСР и ЧИ		166 245,55		166 245,55							
14	Разширяване на предлаганите услуги от „РУМЕЛ“ ЕООД, чрез закупуване на специализирана изчислителна техника	73 096,80	73 096,80	ПРСР и ЧИ		54 822,60		18 274,20							
15	Оборудване на зала за видеоконференции и работни срещи	20 202,69	20 202,69	ПРСР и ЧИ		15 152,01		5 050,68							
16	Иновативно животновъдно стопанство „САКАР МИЙТ“ ЕООД	61 062,46	61 062,46	ПРСР и ЧИ		30 531,23		30 531,23							
17-21	Инвестиции в технологична и екологична модернизация за подобряване на цялостната дейност в земеделското стопанство - 5 проекта	973 878,15	973 878,15	НПВУ и ЧИ		486 939,06		486 939,09							
22	Закупуване на автоматизирани машини за осигуряване на храна за животните в стопанството	238 611,26	238 611,26	НПВУ и ЧИ		119 305,63		119 305,63							
23	Разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие „Аркус 99“ ООД, гр. Харманли	2 111 952,51	2 109 399,04	ПРСР и ЧИ		1 054 699,52		1 054 699,52							
24	Инвестиции в технологична и екологична модернизация в стопанството на „Аркус 99“ ООД	201 568,82	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
25	Инвестиции допринасящи за опазване на компонентите на околната среда и допринасящи за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване на земеделското стопанство	116 510,55	116 510,55	НПВУ и ЧИ		58 255,27		58 255,28							
26	Изграждане на Фотоволтаична Електрическа Централ за захранване на електрическа помпа за капково напояване на 65 дка Биологична овощна градина-круши и частична подмяна на съществуваща система за капково напояване	113 701,38	113 701,38	ПРСР и ЧИ		56 850,70		56 850,68							
27	Технологична и екологична модернизация в стопанството на Галя Добрева Кръстева	55 999,32	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
28	Закупуване на селскостопанска техника	257 191,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
29	Технологична и екологична модернизация-закупуване на прикачна техника за агротехнически дейности в зеленчукови култури	63 224,98	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
30	Технологична и екологична модернизация в животновъдството чрез закупуване и внедряване на Доилна зала за овце 1x18броя , за автоматизирано доене	48 000,02	48 000,02	НПВУ и ЧИ		24 000,01		24 000,01							
31	Технологична и екологична модернизация-Закупуване на Трактор LS 68 к.с. за агротехнически дейности в 56,912 дка трайни насаждения-лозя	70 799,99	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
32	Инвестиции в технологична и екологична модернизация за подобряване на цялостната дейност в земеделското стопанство - Елена	226 876,28	226 876,28	НПВУ и ЧИ		113 438,14		113 438,14							
33	Инвестиции в технологична и екологична модернизация за стопанството на ЕТ Александър Живанкин	681 000,02	681 000,02	НПВУ и ЧИ		340 500,01		340 500,01							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
34	Закупуване на автоматизирана линия за подготовка на продукцията за продажба и на земеделска техника.	963 684,60	963 684,60	ПРСР и ЧИ		481 842,29		481 842,31							
35	Инвестиции в закупуване на земеделска техника и изграждане на АФВЦ за собствени нужди за постигане на технологична и екологична модернизация	667 338,45	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
36	Закупуване на оборудване за биволовдна ферма - с. Българин, общ. Харманли	235 809,57	235 809,57	ПРСР и ЧИ		117 904,78		117 904,79							
37	Модернизация на дейността по осигуряване на естествени фуражи за нуждите на млечните крави в стопанството на фирма ЗЛАТЕН КЛАС - БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ООД	138 400,05	138 400,05	НПВУ и ЧИ		69 200,02		69 200,03							
38	Модернизиране на земеделско стопанство, чрез закупуване на нова техника	69 599,99	69 599,99	ПРСР и ЧИ		41 759,98		27 840,01							
39	Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъден обект в с. Овчарево, обл. Хасково	197 930,00	197 930,00	НПВУ и ЧИ		98 965,00		98 965,00							
40	Инвестиции за опазване околната среда при отглеждане на едър рогат добитък	361 950,46	361 950,46	ПРСР и ЧИ		180 975,22		180 975,24							
41	Закупуване на земеделска техника	172 113,04	172 113,04	НПВУ и ЧИ		86 055,21		86 057,83							
42	Изграждане на животновъден обект в с. Преславец	1 410 759,80	375 591,42	ПРСР и ЧИ		187 795,71		187 795,71							
43	Инвестиция в специализирана земеделска техника за нуждите на земеделско стопанство в землището на община Харманли	104 695,56	104 695,56	ПРСР и ЧИ		52 347,77		52 347,79							
44	Технологична модернизация в стопанството на Нидал 1 ЕООД	170 549,39	170 549,39	НПВУ и ЧИ		85 274,69		85 274,70							
45	Закупуване на оборудване и земеделска техника за модернизация и автоматизация на кравеферма - с. Орешец, общ. Харманли	659 894,38	659 894,38	ПРСР и ЧИ		329 947,21		329 947,17							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
46	Закупуване на оборудване за овцевъдна ферма	74 519,98	74 519,98	НПВУ и ЧИ		37 259,99		37 259,99							
47	Отглеждане на зеленчуци	29 337,02	0,00	ПРСР		0,00									
48	Инвестиции в закупуване на земеделска техника за постигане на технологична и екологична модернизация на земеделското стопанство	636 215,85	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
49	Закупуване на земеделска техника и оборудване за подобряване на дейността на земеделското стопанство	1 152 790,61	800 470,80	ПРСР и ЧИ		400 235,40		400 235,40							
50	Инвестиции допринасящи за опазване на компонентите на околната среда и допринасящи за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване на земеделското стопанство САКАР МИЙТ ЕООД	98 759,98	98 759,98	НПВУ и ЧИ		49 379,99		49 379,99							
51	Внедряване на технологии за пестене на вода в животновъдството	155 316,68	155 316,68	ПРСР и ЧИ		77 658,34		77 658,34							
52	Разширение и модернизация на гъбарник за култивирани гъби	1 232 645,74	581 525,02	ПРСР и ЧИ		290 762,51		290 762,51							
53	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в стопанството на „СТИЛ С“ ООД чрез модернизация на съществуваща система за напояване	131 449,52	131 449,52	ПРСР и ЧИ		65 724,75		65 724,77							
54	Система за поене на едри преживни животни	419 500,03	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
55	Земеделска техника за обработка на лозя	868 199,94	868 199,94	НПВУ и ЧИ		434 099,97		434 099,97							
56	Изграждане на дребномащабна инфраструктура за обслужване на отдиха и туризма по протежение на екопътека до светилище „Семерчето“, Община Харманли - ППР	27 600,00	18 000,00	ОБ	18 000,00										
57	Изграждане на дребномащабна инфраструктура за обслужване на отдиха и туризма по протежение на екопътека „Дефилето“, Община Харманли - ППР	27 600,00	20 000,00	ОБ	20 000,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Харманли за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

№	Проект/действие	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства 2025 г. (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2022	2023	2024	2025	2025<
58	Представяне и разпространение пред българска публика на четвърти музикален албум „Един от тях“ на No More Many More и децентрализация на културно съдържание	16 540,00	16 540,00	НПВУ и ЧИ		14 886,00		1 654,00							
59	Предоставяне на нови културно-образователни услуги за жителите и гостите на община Харманли чрез многофункционална лазерна кино (мултимедийна) система	135 682,01	135 682,01	ПРСР и ЧИ		94 369,21		41 312,80							
60	Благоустрояване на пространство пред НЧ „Дружба-1870“ гр. Харманли - инженеринг	134 971,00	0,00	ЦБ			0,00								
61	Проект „Изграждане на дигитален клуб в село Доситеево“ (Народно Читалище „Архимандрит Доситей – 1908“)	27 500,01	0,00	НПВУ		0,00									
62	Проект „Пътуване през времето по Марица“ („Maritsa Timeless Journey“)	670 261,22	8 197,00	Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027		8 197,00									
63	Проект „Въвеждане на нисковъглероден туризъм в трансграничен район на сътрудничество България и Турция“ („Low-carbon CBC“)	224 327,74	14 551,00	Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България - Турция 2021-2027		14 551,00									
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:		94 377 065,22	27 662 689,80		947 015,00	16 282 666,09	3 040 894,00	7 327 644,71	64 470,00						
